



## Raport final privind implementarea proiectului

### „Alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu”

#### I. Date generale:

**Aplicant:** Primăria satului Roșu, raionul Cahul

**Parteneri:** Nu sunt;

**Durata de implementare a proiectului:** 12 luni

**Bugetul proiectului aprobat:** 3161,00 mii lei

**Suma solicitată din FNDR:** 0 lei

**Suport financiar alocat de către Guvernul României prin intermediul GIZ**

**Moldova:** 2824,00 mii lei

**Obiectivul general al proiectului:** Satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu apă ale populației din satul Roșu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare cu apă, în cooperare cu Î.M. ”Apă Canal” Cahul.

**Beneficiari:** Beneficiul acestui proiect va fi aprovizionarea cu apă a instituțiilor preșcolare, gimnaziu, Organizația Medicilor de Familie, 800 gospodării, 8 societăți cu răspundere limitată, 35 de întreprinderi.

#### II. Finanțarea proiectului.

În vederea inițierii și implementării ulterioare a proiectelor în domeniul modernizării serviciilor publice locale, au fost evaluate propunerile de proiecte depuse la ADR SUD în cadrul concursului I Apel al propunerii de proiect la 10 iunie 2010. GTZ în comun acord cu ADR Sud au selectat proiectul ”Aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu”, prioritatea 1 din SRD SUD ”Reabilitarea infrastructurii fizice”, Masura 1.1 ”Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, de canalizare și a stațiilor de epurare”. În decembrie 2010 în Cahul a fost semnat un Memorandum de Înțelegere (MÎ), pentru inițierea și implementarea proiectului-pilot „Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Roșu, raionul Cahul”. Scopul acestui MÎ a fost crearea unui parteneriat pentru implementare a proiectului.

În urma desfășurării licitației pentru selectarea companiei de construcție a fost semnat contractul de antrepriză cu compania SRL ”Izodromgaz”. Valoarea contractului constituind suma de 2 089 995 lei.

La începutul lunii noiembrie 2011, a fost lansată oficial etapa de construcție a proiectului și lucrările au început în ultima săptămână din noiembrie 2011.

### **III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului**

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- 1. Lansarea proiectului.**
- 2. Activitati de achizitii publice.**
- 3. Crearea comitetul de monitorizare a proiectului;**
- 4. Informarea cetățenilor cu privire la derularea proiectului;**
- 5. Crearea cooperativelor pe străzi și alegerea liderilor acestora;**
- 6. Întâlniri de lucru cu personalul de organizații, școală, grădiniță, biroul medicilor de familie;**
- 7. Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în localitatea Roșu.**
- 8. Finalizarea proiectului.**

#### IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1	<b>Lungimea rețelelor noi construite.</b> (valoarea inițială-0)		
	Lungimea rețelei de apeduct – 12,5 km	Lungimea rețelei de apeduct nou construită – 14,3 km	Aplicantul a dispus de proiectul tehnic pentru construcția apeductului. Acesta a fost depus odată cu cererea de finanțare. În urma modificărilor apărute lungimea rețelei de apeduct noi construite a constituit 14,3 km.
2	<b>Lungimea rețelelor renovate.</b> (valoarea inițială-0)	0	Reieșind din faptul că în cadrul proiectului a fost prevăzută integral construcția rețelei noi de apeduct, nu au fost renovate rețele de apeduct.
3	<b>Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu apă și servicii de canalizare</b> (valoarea inițială - 0)	510,8 m3/zi	După finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei noi de apeduct în satul Roșu, raionul Cahul, obiectul dat a fost dat în gestiune către Î.M. ”APĂ CANAL” Cahul. Conform analizei efectuate, capacitatea de livrare a apei pentru cei 3700 de locuitori ai satului Roșu Î.M. ”APĂ CANAL” Cahul va livra apă în volum de 510,8 m3/zi.
4	<b>Volumul de apă m3/lună,</b> (valoarea inițială - 0)	1500 m3/lună	Odată cu conectarea 100 % a tuturor gospodăriilor la sistemul de apeduct, va fi livrat volumul de apă de 8192,5 m3/lună.
5	<b>Volumul de apă consumat în mediu de o persoană</b> (m3/persoană/lunar) (valoarea inițială - 0)	2,5 m3/zi	Volumul de apă consumat de o persoană pe lună fiind de 2,5 m3/lună.
6	<b>Persoane instruite</b> (valoarea inițială - 0)	Total: 12 din care - 0 bărbați - 0 femei Angajați ai serviciului – 0 din care -0 bărbați -0 femei Reprezentanți APL - 12, din care - 7 bărbați - 5 femeii	La momentul raportării au fost instruite circa 12 persoane din totalul de 50 de persoane planificate inițial ceea ce constituie 24%. Personalul rămas neinstruit va fi instruit în anul 2013 -2014, conform programului de instruire a personalului Î.M. ”Apă - Canal Cahul”, Totodată, domeniile de instruire a personalului va fi axat pe instruirea în domeniul managementului operațional, managementului financiar, managementul pierderilor de apă în rețea, managementul implementării proiectului.

7	<b>Persoane informate</b> (valoarea inițială - 0)	3700 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 3 reportaje radio, și publicate 5 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, <a href="http://www.civic.md">www.civic.md</a> , <a href="http://www.icomunicat.md">www.icomunicat.md</a> , <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a> ș.a.). De asemenea, au fost amplasate 3 panouri de informare.
<b>Indicatori de rezultat</b>			
8	<b>Locuri de muncă noi create</b> (valoarea inițială - 0)	16 locuri de muncă create pe termen scurt 2 locuri de muncă create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 16 locuri noi de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din s. Roșu, care au fost angajate pe perioada efectuării lucrărilor de construcții la apeduct. Indicatorul planificat (18 persoane angajate pe termen lung) nu a fost realizat la moment. Se planifică ca după finalizarea conectărilor, în localitate vor fi angajate de către ÎM "Apă Canal" Cahul, încă 2 persoane pentru colectarea datelor și distribuirea bonurilor de plată pentru servicii.
9	<b>Bransamente la rețele construite</b> (valoarea inițială - 0)	841 de gospodării cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct	În rezultatul construcției rețelei de apeduct în s. Roșu au fost conectați circa 503 gospodării din 841 de gospodării. Pentru perioada rece a anului lucrările de conectare a cetățenilor la sistemul de apeduct au fost stopate. Lucrările de conectări rămase urmează a fi executate începând cu luna aprilie 2013, odată cu îmbunătățirea condițiilor climatice. Se preconizează că rata de conectare planificată conform indicatorilor va fi de 90%.
10	<b>Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct</b> (valoarea inițială - 0)	2323 cetățeni ai s. Roșu, r-ul Cahul	În urma construcției sistemului de apeduct, a fost îmbunătățit accesul la serviciile de aprovizionare cu apă pentru 3700 de cetățeni, agenți economici, instituțiile publice ale localității s. Roșu. Totodată, accesul la servicii de apeduct este asigurat, până în prezent rata de conectare este destul de satisfăcătoare, la momentul raportării fiind conectate 503 gospodării din 841.

## V. Finalizarea proiectului.

În urma implementării proiectului dat a fost atins în proporție de 100 % obiectivul general, prin satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor s. Roșu. Nivelul de satisfacere a cetățenilor s. Roșu cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă pot fi regăsiți în următorii indicatori: Branșamente la rețele construite; Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de apeduct.

La data de 21 august 2012 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 5 din 12 august 2012*). La data de 22 noiembrie 2012 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 11 din 22 noiembrie 2012*).

La data de 8 noiembrie 2012 ADR Sud, în temeiul contractului de finanțare semnat între ADR Sud și compania de construcție SRL "Izodromgaz" și a memorandumului de înțelegere încheiat între cele șase părți (ADR Sud, GIZ, Consiliul Raional Cahul, Primăria or. Cahul, Primăria s. Roșu, Î.M. "Apă Canal" Cahul), a predat obiectul construit către primăria s. Roșu, raionul Cahul (*Act de primire-predare a obiectului din 19 decembrie 2012*).

**Director ADR Sud**



**Maria CULEȘOV**


## Anexa 1.

### 1. Pînă la implementare



### 2. Procesul de implementare



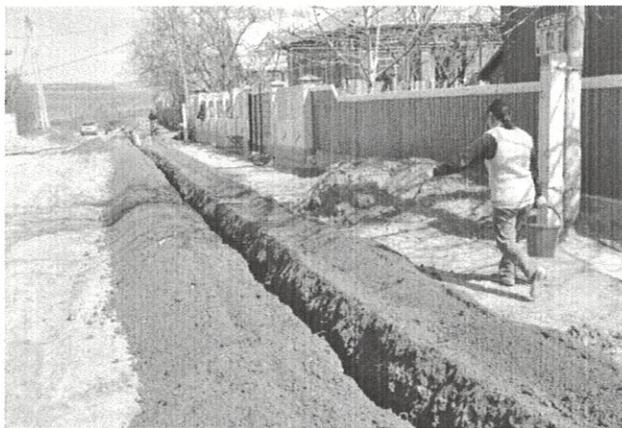

### 3. Situația după implementarea proiectului.

