



MU

Raport final privind implementarea proiectului

„Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din s. Zaim”.

I. Date generale:

Aplicant: Primăria comunei Zaim, r-ul Căușeni

Partener: Consiliul raional Căușeni, primăria orașului Căușeni, primăria orașului Căinari, primăria satului Sălcuța, primăria satului Taraclia

Durata de implementare a proiectului: 12 luni

Bugetul proiectului aprobat: 1800,00 mii lei

Suma solicitată din FNDR: 1800,00 mii lei

1. **Obiectivul general al proiectului:** Oferirea oportunităților reale de înscriere a Regiunii de Dezvoltare Sud în circuitul turistic național și internațional prin construcția drumului de acces spre Casa Muzeu Alexei Mateevici din satul Zaim, raionul Căușeni.

Beneficiari:

- 5 angajați ai Casei-muzeu;
- 17776 locuitori ai satelor Zaim, Sălcuța, Taraclia, Căinari;
- 3500 turiști internaționali, care vizitează în fiecare an muzeul;
- 1500 personalități de pretutindeni care în fiecare an participă la manifestările naționale desfășurate la Zaim;
- delegațiile oficiale și turiștii care vizitează ținutul din sudul Basarabiei

II Finanțarea proiectului.

Proiectul „Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din s. Zaim”. a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului de propuneri de proiecte 2012. Prin Hotărârea de Guvern Nr.933 din 18 decembrie 2012 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2013 – 2015. Finanțarea proiectului în valoare de 1800 mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr 18/12 din 20 decembrie 2012. Ulterior, prin Decizia CNCDR nr. 2/13 din 21.06.2013 a fost aprobată suma de 1764,40 mii lei.

În urma desfășurării licitației publice privind achiziționarea lucrărilor construcție ”R 26 – drum de acces spre muzeul memorial ”Alexei Mateevici” din s. Zaim, raionul Căușeni” la data de 05.03.2013, a fost selectat câștigător SRL „Irinda - Prim”.

La data de 19 martie 2013 a fost semnat contractul cu SRL „Irinda - Prim” în suma de 1 755 610,00 lei cu perioada de realizare a lucrărilor de 2 luni calendaristice. Contractul a fost înregistrat la Agenția de Achiziții Publice la data de 01.04.2013.

La data de 18 iulie 2013 a fost semnat acordul adițional nr.1, la contractul de antrepriză nr. 4/L/13 din 19 martie 2013 cu SRL „Irinda - Prim”, în valoare de 1512818,18 lei, valorificat suma de 1512 441, 81 lei.

Cheltuieli pentru supravegherea tehnică – a fost contractată suma de 8778,00 lei, valorificată suma de 7562,21 lei (din FNDR)

În total au fost efectuate cheltuieli în valoare de 1 520 004, 02 lei din FNDR (100%) din FNDR.

În cadrul proiectului au fost efectuate economii în sumă de 244 383, 98 lei.

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- 1. Lansarea proiectului.**
- 2. Activități de achiziții publice.**
- 3. Monitorizarea proiectului**
- 4. Executarea lucrărilor de construcție**
 - a.* Pregătirea terenului pentru construcția drumului
 - b.* Lucrări de terasament
 - c.* Amenajarea îmbrăcămintei rutiere
 - d.* Lucrări de artă
 - e.* Construcția platformei pentru staționare și virare (parcare auto)
- 5. Evaluarea lucrărilor îndeplinite, semnarea actului de recepție finală**
- 6. Transmiterea obiectului la bilanțul beneficiarului**

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1 Localități beneficiare de drum. (valoarea inițială-1)			
1	1 localitate care beneficiază de drum	1 localitate care beneficiază de drum	Reieșind din caracterul local al drumului, beneficiar direct al drumului este c. Zaim, raionul Căușeni.
2 Lungimea drumului construit (valoarea inițială-0 km)			
0,33 km de drum local construit (valoarea inițială-0 km)	0,33 km de drum local construit	0,33 km de drum local construit	Indicatorul a fost atins pe deplin. În termen de 2 luni au fost executate lucrările de construcție a porțiunii de drum de 330 m. Asigurând accesul către Casa – Muzeu ”Alexei Mateevici”, beneficiarii finali.
3 Persoane informate (valoarea inițială - 3500)			
7000 persoane informate	7500 persoane informate	7500 persoane informate	În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile de televiziune „Aici TV” și „Studio L” 6 reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost difuzate 2 reportaje radio (, Radio Moldova), și publicate 8 articole în presa scrisă și electronică (Gazeta de Sud, www.civic.md , www.icomunicat.md , www.adrsud.md ș.a.). Deasemenea, evenimentul de lansare a proiectului la care au participat peste 45 persoane, a contribuit la asigurarea transparenței în cadrul proiectului. Se estimează că peste 17000 persoane au fost informate privitor la activitățile proiectului.
Indicatori de rezultat			
8 Persoane cu acces îmbunătățit la drum (valoarea inițială - 0)			
4561 persoane cu acces îmbunătățit la drum	7356 persoane cu acces îmbunătățit la drum	7356 persoane cu acces îmbunătățit la drum	În rezultatul reparației drumului beneficiază direct 7356 de locuitori a c. Zaim locuitorii din zona de Sud a Republicii Moldova, atât turiști cât și turiști internaționali, pentru care a fost îmbunătățit accesul către Muzeul Memorial ”Alexei Mateevici”.
9 Automobile pe trafic (valoarea inițială: în zile lucrătoare – 6; În week-end și zile de sărbători – 3; noaptea - 3)			
În zile lucrătoare - 18 În week-end și zile de sărbători – 108 Noaptea - 9	În zile lucrătoare -18 În week-end și zile de sărbători – 108 Noaptea - 9	În zile lucrătoare -18 În week-end și zile de sărbători – 108 Noaptea - 9	În urma implementării proiectului a sporit considerabil traficul transportului pe porțiunea dată de drum. Asigurând accesul turiștilor către Casa Muzeu cu autobuse, microbuze, microbuze, totodată evenimentele de ceremonii de căsătorie, înmormântări, precum accesul îmbunătățit a enoriașilor către lăcașul bisericesc.

V. Finalizarea proiectului.

La data de 26 iunie 2013 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pe obiectul dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului reieșind din faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic (*Proces verbal nr. 2 din 26 iunie 2013*). La data de 23 iulie 2013 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 4 din 23 iulie 2013*).

La data de 20 septembrie 2013 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 933 din 18 decembrie 2012 și a acordului de parteneriat din 30 aprilie 2013, a predat obiectul construit către primăria c. Zaim, raionul Căușeni (*Act de primire-predare a obiectului din 20 septembrie 2013*).

Director ADR Sud




Maria CULEȘOV

Anexa 1.

1. Situația pînă la implemenatrea proiectului



2. Procesul de implementare

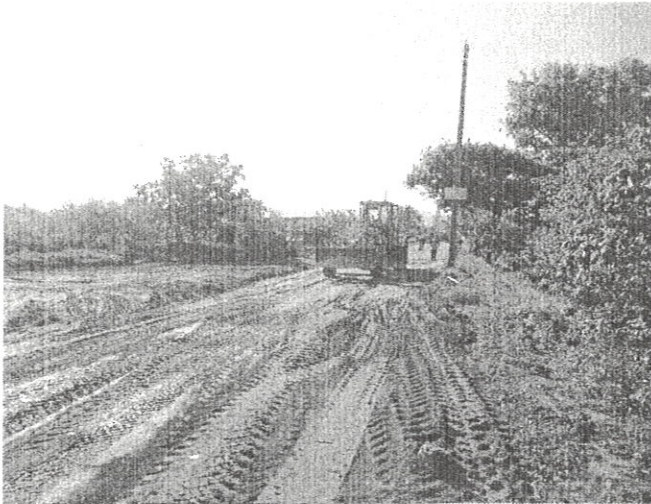

3. Situația după implementarea proiectului.

