



Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Prezentat pentru aprobare:

Maria CULEȘOV
Director



Raport trimestrial de activitate
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru perioada ianuarie-martie 2019

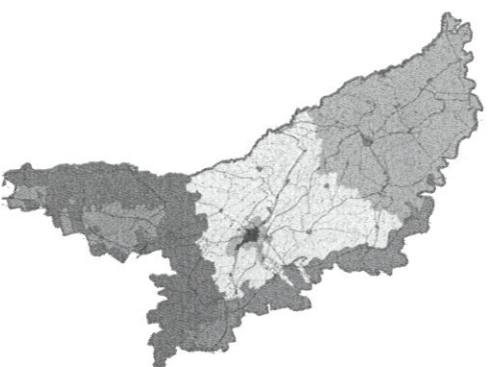

APROB:

Dorin ANDROS,
Secretar de Stat

"7" _____
2019

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE					
1.4.	Participare în implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS"	Participarea în ședințele grupului de lucru implicate în implementarea proiectului	Trim I-IV SPRCE	1 sesiune de instruire desfășurată 7 participanți	Realizat: În perioada vizată, au fost desfășurate 2 ședințe de lucru (22.01.2019; 06.02.2019) privind implementarea proiectului: "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS", cu participarea reprezentanților MADRM, ADR, Agenției Cehe pentru Dezvoltare și Cooperare, GeoTest SRL ș.a. În perioada 19-21 aprilie 2019, a avut loc prima sesiune de instruire privind utilizarea tehnologiei GIS, unde au participat 7 reprezentanți din cadrul ADR Sud.
1.5.	Planificarea activității ADR Sud	Elaborarea și prezentarea spre aprobare CRD Sud a Planului de implementare a SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2019	Trim I SPRCE	1 plan anual de implementare a SDR Sud aprobat de CRD Sud	Realizat: Planul de implementare a SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2019 a fost elaborat și prezentat MADRM pentru coordonare în termeni stabiliți. Documentul a fost prezentat membrilor CRD Sud în cadrul ședinței din 15 martie și a fost aprobat prin decizia nr. 1/02 din 15.03.2019. Totodată, membrii CRD, au luat act de cunoștință cu privire la Planul anual de acțiuni a ADR Sud pentru anul 2019.
		Elaborarea și prezentarea spre aprobare MADRM a Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2019	Trim I SPRCE	1 plan anual aprobat de MADRM	Realizat: Planul anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2019 a fost elaborat și prezentat spre coordonare și aprobare către MADRM în termeni stabiliți.
1.6.	Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale	Aplicarea sistemului de M&E bazat pe rezultate pentru monitorizarea implementării SDR Sud	Trim I, III SPRCE	1 bază de date cu indicatori actualizată	Realizat: În trimestrul I al anului curent, în vederea monitorizării implementării SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2018, a fost colectată informația și actualizată baza de date cu

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		2016-2020 și POR Sud 2017-2020				indicatori de monitorizare. Această bază de date este anexată la Raportul de progres privind implementarea SDR, și conține 23 de indicatori ce măsoară gradul de îndeplinire a obiectivului general și a celor specifici din strategie.
		Elaborarea rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Sud și prezentarea către MADRM și CRD Sud	Trim I, III	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat CRD și MADRM	Realizat: Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2018 a fost elaborat și prezentat în termen MADRM pentru coordonare și membrilor CRD pentru aprobare. Raportul a fost aprobat prin decizia CRD nr. 1/01 din 15.03.2019.
		Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM	Trim I-IV	SPRCE	2 rapoarte elaborate și prezentate MADRM	Realizat: În perioada vizată, a fost elaborat și prezentat către MADRM raportul trimestrial (trim IV) și raportul anual, privind implementarea Planului anual de acțiuni a ADR Sud pentru anul 2018.
II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR						
2.1.	Implementarea proiectului ” Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni ”	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului (etapa I Rețele de canalizare)	Trim I	SMP	-	Nerealizat: Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor s-au aflat la Agenția Supraveghere Tehnică pentru control. Controlul volumelor la lucrările executate a fost finalizat. Urmează organizarea recepției finale în luna aprilie 2019.
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim I	SMP	-	Nerealizat: Va fi executat după recepția finală.	

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
		Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim I	SMP	-	Nerealizat: Va fi executat după recepția finală.
		Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție (etapa II, Stația de epurare)	Trim I-II	SFA	-	În proces de realizare: Activitatea respectivă este în proces de realizare deoarece dispoziția CR Căușeni privind la contribuția locală în valoare de 5 mln MDL a fost primită de ADR Sud abia la 25.03.2019. Pentru procedura dată a fost publicat anunțul de intenție, la moment sunt inițiate activitățile privitor la desfășurarea procedurii de achiziții publice.
2.2.	Implementarea proiectului " Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sârma – Tomai – Sărăteni - Hârtop la rețeaua de drumuri naționale R3"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV	SMP	2 vizite de monitorizare efectuate 1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: A fost pregătit șantierul pentru reluarea lucrărilor de construcții. Au fost operate modificări în proiect conform cărora a fost încheiat Acordul adițional nr.2 și Contractul prin procedura de negocieri fără publicare. Desfășurată 1 ședință a grupului de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.3.	Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"	Monitorizarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV SMP	1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare beneficiarul a prezentat modificări la proiectul de execuție. Grupul de lucru pe achiziții a examinat modificările operate la care a venit cu recomandări de corectare a documentației de deviz. Urmează prezentarea de către Beneficiar a modificărilor corectate, examinarea repetată, și transmitere spre aprobare către Agenția Achiziții Publice. Lucrări de construcție vor reîncepe în perioada caldă. Desfășurată 1 ședință a grupului de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.4.	Implementarea proiectului "Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir" (bloc chirurgical)	Monitorizarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-II SMP	1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: La sfârșitul lunii martie au fost efectuate lucrări de pregătire a șantierului. A fost desfășurată o ședință de lucru la obiect privind pregătirea a unei jumătăți a clădirii pentru instalarea sistemului de ventilație (eliberarea încăperilor) și începerea lucrărilor de construcții la începutul lunii aprilie. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.5.	Implementarea proiectului "Oportunități pentru	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții	Trim I-II SFA	-	Nerealizat: La moment este în proces de modificare proiectul

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud" (ZEL Căușeni).	publice pentru lucrări de construcție				tehnic de execuție, fără care, evident, nu este posibil a întreprinde careva măsuri pentru implementarea acestuia.
2.6.	Implementarea proiectului "Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, Basarabeasca"	Organizarea și desfășurarea evenimentului de lansare a proiectului	Trim II	SMP	1 eveniment de lansare desfășurat	Realizat: Evenimentul a fost organizat la data de 20 februarie 2019, când au fost începute lucrările de construcție conform ordinului nr. 26 din 20.02.2019.
		Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim II	SFA	1 procedură de achiziții desfășurată 1 contract semnat	Realizat: Pentru implementarea proiectului dat au fost desfășurate prin intermediul M-Tender 2 proceduri de achiziții publice, după cum urmează: 1 - licitație publică în rezultatul căreia a fost încheiat Contractul de antrepriză nr. 02/L/19 din 15.02.2019. Antreprenor general - SRL „Acit Trans”. Valoarea Contractului - 8 924 170,22 MDL, inclusiv TVA. 1 - contract de valoare mică nr. 03/S/19 din 15.02.2019. Responsabil tehnic - Andrei Rusnac. Valoarea Contractului - 24 999,00 MDL, inclusiv TVA.
		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim IV	SMP	4 vizite de monitorizare efectuate 1 ședință desfășurată	Realizat: În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările executate de antreprenor: lucrări de trasare a axei drumului, lucrări de terasamente pentru aducerea terenului la cotele proiectului, executarea rigolei din pământ.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.7. Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 1 "Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu, etapa II, Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu."	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	1 vizită de monitorizare efectuată 1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: Au fost operate modificări în proiectul de execuție, a fost încheiat Acordul Adițional de excludere a unor lucrări. Urmează organizarea recepției la terminarea lucrărilor. Efectuată 1 vizită de monitorizare. Desfășurată 1 ședință a grupului de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat	
2.8.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 1)	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	6 vizite de monitorizare efectuate 6 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare au fost monitorizate lucrările de construcții efectuate de către Antreprenor: 1. Construcția Stației de Pompare nr.5 lucrările sunt executate în proporție de 98%; 2. La platforma B1 au fost construite 2 rezervoare de 800 m3, lucrările sunt executate în proporție de 98%; 3. Apeductul magistral este construit în proporție de 98%. Efectuate 6 vizite de monitorizare, desfășurate 6 ședințe de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.9.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 2)	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim I-II	SMP	6 vizite de monitorizare efectuate 6 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: Au fost monitorizate lucrările de construcții a rețelelor interioare distribuție a apei în satul Lebedenco, construcția a 4 rezervoare metalice cu capacitatea de 50 m3, construcția a 2 instalații de dezinfectare a apei, realizate de către antreprenor. Efectuate 6 vizite de monitorizare, desfășurate 6 ședințe de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.10. Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 3 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa - Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza" și rețelele interioare" (ETAPA II)	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: La moment este elaborat proiectul tehnic preliminar. Urmează ca primăriile com. Pelinei și Găvănoasa să transmită către ADR Sud planurile geometrice privind amplasarea stațiilor de clorinare proiectate și Avizele de racordare la energia electrică ca ulterior să fie inițiate serviciile de proiectare pentru ETAPA II. Efectuate 2 ședințe de lucru. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.11. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 1 " Construcția apeductului magistral Leova – largara "	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală	Trim I-II	SMP	- evenimente desfășurate - acte de recepție finală semnate	În proces de realizare: La data de 30.01.2019 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, la data de 20 februarie 2019 a avut loc activitatea de control volume și costuri efectuată de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, ca urmare la data de 21.03.2019 antreprenorul a informat despre înlăturarea obiecțiilor consemnate de către membrii comisiei la terminarea lucrărilor. Recepția finală urmează a avea loc în luna aprilie 2019. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.12. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 2 " Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților largara, Filipeni,	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: Au fost monitorizate serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție. În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat Proiectul Tehnic Preliminar (FAZA2). Urmează prezentarea de către beneficiar a următoarelor documente:

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
Romanovca și Cupcui din raionul Leova”					1. Avizele de racordare la energia electrică pentru stațiile de dezinfecție și stația de repompare a apei; 2. Condițiile tehnice de subtraversare a căii ferate (2 subtraversări) or. largara eliberate de către Î.S. Calea Ferată din Moldova; 3. Condițiile tehnice de subtraversare și amplasare în zona de protecția a drumurilor regionale a rețelelor de alimentare cu apă. A fost desfășurată o ședința publică de prezentare a Proiectul Tehnic Preliminar și Ședința Comitetului Director Local. Elaborat 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.13. Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 3 ” Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP		În proces de realizare: Au fost monitorizate serviciile de elaborare a proiectului tehnic de execuție. În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat Proiectul Tehnic Preliminar (FAZA2). Urmează prezentarea de către beneficiar a următorului document: Condiții tehnice de la Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru traversarea drumului național prin metoda închisă, după care vor fi inițiate lucrările în FAZA 3. Proiect tehnic funcțional. A fost desfășurată o ședința publică de prezentare a Proiectul Tehnic Preliminar și Ședința Comitetului Director Local. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
2.14. Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din or. Basarabeasca"	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: A fost elaborat, verificat și aprobat Proiectul Tehnic Preliminar (Faza 2). Inițiată Faza 3 a serviciilor de proiectare. A fost desfășurată o ședința publică de prezentare a Proiectului Tehnic Preliminar și Ședința Comitetului Director Local. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.15. Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova"	Elaborarea documentației de proiectare	Trim I-II	SMP	-	În proces de realizare: A fost elaborat, verificat și aprobat Proiectul Tehnic Preliminar (Faza 2). Inițiată Faza 3 a serviciilor de proiectare. A fost desfășurată o ședința publică de prezentare a Proiectului Tehnic Preliminar și Ședința Comitetului Director Local. Elaborate 1 raport trimestrial și 13 rapoarte săptămânale și transmise MADRM.
2.16. Implementarea proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor"	Elaborarea profilurilor investiționale raionale și a Catalogului investițional regional	Trim I-II	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada de raportare au fost definitive 4 profiluri investiționale: Căușeni, Leova, Basarabeasca, Taraclia. 1 profil investițional, Căușeni, a fost aprobat prin decizia Consiliului Raional în data de 22 martie, 2019. 4 Profiluri investiționale și catalogul investițional sunt în proces de elaborare.
III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ					

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
3.2. Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile obiectivelor aferente strategice	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	Trim I-IV	SPRCE	27 sesiuni desfășurate 12 participanți	Realizat: Pe parcursul trimestrului I, 12 specialiști ADR Sud au beneficiat de instruire în următoarele domenii: - privind planificarea strategică; - privind implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS); - în domeniul furnizării de servicii de suport antreprenorial; - privind managementul serviciilor de alimentare cu apă și sanitație ș.a.
3.4. Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, operatori de servicii, etc.)	Organizarea și desfășurarea ședințelor de informare pentru APL din RDS în vederea cu familiarizării acestora cu politicile statului în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv cu documentele de planificare strategică și programare la nivelul RDS.	Trim I-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada vizată au fost desfășurate activități de planificare a ședințelor de informare. În acest context a fost elaborată agenda draft și schița calendarului ședințelor ce urmează a fi desfășurate pe parcursul trimestrului II.
	Facilitarea diseminării în RDS a lecțiilor învățate din planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice	Trim II	SMP	1 sesiune desfășurată 50 participanți	Realizat Practica de planificare locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice din Basarabeasca a fost prezentată în cadrul unui seminar regional cu tema „Planurile locale de acțiune privind eficiența energetică (PLAEE) - instrument eficient pentru planificarea și atragerea finanțării pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică în

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
3.5.	Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS	Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu	Trim III	SPRCE	2 vizite de studiu 12 beneficiari	Realizat: În perioada de raportare, au fost desfășurate 2 vizite de studiu cu participarea actorilor de dezvoltare regională din RDS, și anume: 21.01-26.01.2019 - Vizită de studiu în Estonia, organizată în cadrul proiectului: "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor", cu suportul UE. Scopul vizitei: Preluarea bunelor practici UE în domeniul furnizării de servicii de suport antreprenorial precum și de schimbare a actualului model de interacțiune între actorii cheie, prin preluarea noilor tehnici de comunicare cu antreprenorii. În cadrul vizitei, din regiunea Sud au participat un angajat din cadrul ADR și 8 reprezentanți ai APL. 25.03-31.03.2019 - Vizită de studiu în Polonia în domeniul managementului serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, organizată de Comunitatea practicienilor din sectorul de apă și sanitație. Scopul vizitei: Susținerea învățării și încurajarea schimbului de cunoștințe între practicienii din sectorul de alimentare cu apă și sanitație în vederea consolidării unui sector cu profesioniști. În cadrul vizitei de studiu au participat din regiunea Sud, un angajat ADR și 2 consultanți GIZ.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
3.6.	Raportarea instruirilor	Raportarea implementării asupra planului anual de instruire	Trim I,III	SPRCE	2 rapoarte elaborate	Realizat: În perioada vizată, au fost elaborate și prezentate către MADRM 2 rapoarte, și anume: 1. Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud pe parcursul perioadei iulie - decembrie 2018; 2. Raportul activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie 2018.
IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR						
4.1.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	Facilitarea implementării în RDS a proiectului "Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană" co-finanțat din fondurile programului de cooperare poloneză.	Trim I-IV	SPRCE	2 APL asistate	Realizat: În perioada de raportare a fost anunțat apel deschis în cadrul Fondului de Granturi Mici 2019 – ediția Revitalizare Urbană. 2 APL din RDS (Căușeni și Cimișlia) au fost asistate în elaborarea conceptelor viabile în concordanță cu principiile Revitalizării Urbane. Primăria Cimișlia – Revitalizarea urbană a sectorului "Școlii Profesionale" din orașul Cimișlia; Primăria Căușeni – Revitalizare urbană a parcului Iurie Noroșeanu.
		Participarea în procesul de implementare în RDS a Programului "Comunitatea mea" lansat de USAID.	Trim I-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada de raportare, a fost actualizat Memorandumul de înțelegere, care urmează a fi semnat între ADR Sud și Programul „Comunitatea Mea” în trim II.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei "Primarii pentru creștere economică" finanțat de UE	Trim I-IV	SPRCE		De asemenea, în vederea formării capacităților pentru traineri, în perioada 21-22 ianuarie 2019, la instruirea în domeniul planificării strategice, organizate cu suportul USAID au participat și reprezentanți din cadrul ADR Sud. În proces de realizare: În perioada 31 ianuarie - 1 februarie 2019, ADR Sud a participat la workshop-ul dedicat dezvoltării economice locale bazată pe practicile și experiențele pozitive realizate de autoritățile publice locale – "Dezvoltarea Economică Locală: gândește și acționează strategic". În aceeași perioadă de raportare, 08.02.2019, un expert internațional a efectuat în Regiunea Sud o vizită de monitorizare a proiectului "Primarii pentru creștere economică" în Moldova, scopul fiind înțelegerea avantajelor/beneficiilor acestui proiect pentru autoritățile locale și partenerii implicați, identificarea punctelor de îmbunătățire pentru o posibilă extindere a acestui proiect. În data de 21.03.2019, ADR Sud a participat la ședința comună cu echipele de implementare a proiectelor pilot din R. Moldova în cadrul inițiativei „Primarii pentru creștere economică”.
4.2. Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către	Trim I-IV	SPRCE	12 apeluri mediatizate	Realizat: În perioada ianuarie-martie 2019, au fost plasate pe pagina web și pe rețele de socializare informația despre lansare a 12 apeluri de propuneri de proiecte.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	donatori și fonduri de finanțare				De asemenea, în vederea informării APL-urilor, a fost actualizat Calendarul apelurilor de Propuneri de proiecte cu informația despre 25 posibilități de finanțare prin intermediul granturilor.
	Asistarea APL din RDS în vederea conceptualizării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă	Trim I-IV	SPRCE	1 APL din RDS asistat în vederea elaborării NC și aplicării pentru finanțare	Realizat: În parteneriat cu Primăria com. Tigheci, AO „Parteneriat Social” și Agenția Națională Arheologică, în perioada trim. I, a fost elaborată propunerea de proiect cu genericul „Patrimoniul Cultural și Istoric al Muzeului „Ceterașii lui Ștefan cel Mare” din Tigheci - Sigur și Accesibil pentru Generațiile Viitoare”, scopul căreia este valorificarea clădirii muzeului menționat ca destinație turistică. Aceasta urmează a fi depusă în cadrul apelului lansat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.
	Elaborarea și aplicarea conceptului de proiect în cadrul Programelor Transfrontaliere	Trim I-II	SPRCE	6 Concepte de proiect aplicate	Realizat: În perioada vizată, au fost active 2 apeluri de propuneri de proiecte în cadrul Programelor Transfrontaliere/ Transnaționale, și anume: Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”, și Programul Transnațional „Dunărea”. Elaborarea de proiecte a presupus un proces activ de cooperare în vederea identificării partenerilor relevanți pentru aplicare, precum și un proces participativ de identificare a soluțiilor în comun. Astfel, în data de 31 ianuarie 2019, în cadrul apelului lansat în cadrul POC BMN, au fost depuse 2 propuneri de proiecte:

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ					
5.1.	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	Actualizarea paginii Web a ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	58 de articole publicate 60135 de vizualizări
					Realizat: În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 58 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020 și în curs de implementare.
					1. „<i>Business Art Tourist Hub</i>”, parteneri în cadrul proiectului depus: entități din Bulgaria, Ucraina și România. 2. „<i>Common Heritage</i>”, parteneri în cadrul proiectului depus: entități din Bulgaria, România, Georgia și Turcia. În data de 8 martie 2019, în cadrul apelului lansat în cadrul Programului Transnațional „Dunărea”, au fost depuse 4 propuneri de proiecte: 1. „<i>Protection and Development of Danube Food and Culinary Cultural Heritage – the Taste Road</i>”, ADR Sud în calitate de partener. 2. „<i>Boosting Industry 4.0 Readiness through Empowering Clusters with Innovative Services</i>”. ADR Sud în calitate de partener. 3. „<i>Development of effective strategies for prosumers empowerment- ESPD</i>”. ADR Sud în calitate de partener. 4. „<i>AGORA</i>”. ADR Sud în calitate de partener asociat.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
	Întreținerea contului facebook al ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	175 de postări Impact persoane - 59594 de vizualizări	Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 60135 de vizualizări. Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 175 de postări ale comunicatelor, avizelor și altă informație relevantă pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 59594 de vizualizări.
	Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS	Trim I-IV	SPRCE	27 de evenimente mediatizate 1 buletin informativ editat și afișat 20 de anunțuri afișate 8 panouri informative actualizate 58 de comunicate elaborate	Realizat: Pe parcursul trim.I, prin intermediul paginii web și paginii de facebook ale instituției, precum și a rețelelor de socializare au fost mediatizate pe larg 27 de evenimente care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergură regională și națională. Printre evenimentele de mediatizare/promovare se numără ședințe ale CRD/CRS, ale Comitetelor Directoare Locale (CDL), grupurilor de lucru pentru achiziții desfășurate în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, evenimente de semnare a contractelor de antrepriză, ședințe organizate de ADR Sud în vederea inițierii lucrărilor, vizite de monitorizare efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, întrevederi cu partenerii de

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
				10 reportaje TV 16 reportaje radio 48 de articole în presa scrisă și electronică locală și națională	dezvoltare în vederea cooperării, lansare proiecte, dezbateri publice, vizite de studiu etc. În scopul informării publicului larg, a mediatizării activității ADR Sud și asigurării vizibilității acesteia, în perioada de raportare au fost afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și din cadrul Consiliilor raionale 1 buletin informativ (ediția nr.1, 2019), anunțuri privind apelurile de propuneri de proiecte și programe de finanțare lansate, fotografii și alte informații relevante despre proiectele aflate în curs de implementare etc. Pentru asigurarea maximală a transparenței și vizibilității activității ADR Sud, în perioada de referință au fost elaborate în total 58 de comunicate, anunțuri, invitații pentru societatea civilă și mass-media și note informative care vizează nemijlocit activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, în curs de implementare, care au fost plasate pe pagina web a ADR Sud și ulterior preluate și difuzate cu o frecvență mai mare de site-urile și sursele media. Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune și s-au regăsit în 10 reportaje TV, 16 reportaje radio, 48 articole în presa scrisă și electronică locală și națională. Activitatea ADR Sud a fost reflectată în emisiunile

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.	Trim II-IV	SPRCE	1 eveniment 150 de materiale promoționale distribuite	Realizat: În data de 6 februarie 2019, ADR Sud a participat, în calitate de partener, alături de Mișcarea Ecologistă din Moldova, la Conferința regională „Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea de sud a Republicii Moldova. Reglementări și soluții pentru utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă. În cadrul acestui eveniment, de către specialiștii ADR Sud a fost elaborată și prezentată participanților din rândul APL, ONG-urilor de mediu, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției "Apele Moldovei" ș.a., o informație amplă privind proiectele de aprovizionare cu apă și canalizare, implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud de către Agenție, din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și cu suportul partenerilor de dezvoltare. De asemenea, participanților la conferință le-au fost distribuite 150 de materiale promoționale. Au fost prezenți circa 70 reprezentanți ai ONG de mediu, APL, MADRM, ADR Sud, inspecțiilor ecologice etc.
		Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud "Dezvoltarea regională"	Trim I-IV	SPRCE	1 buletin elaborat, editat și distribuit	Realizat: În perioada de referință a fost elaborat 1 buletin electronic informativ "Dezvoltare regională" (Nr. 1, Anul 2019), acesta fiind distribuit unui număr de circa 600 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabili	Indicatori de progres	Realizat
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ					
6.2. Asigurarea secretariatului CRD Sud	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud	Trim I-IV	SPRCE	1 ședință CRD desfășurată cu succes Rata de participare a membrilor CRD la ședințe - 56,25 %	Realizat: În data de 15.03.2019, a fost organizată și desfășurată ședința CRD Sud. În cadrul ședinței au fost aprobate 4 decizii. Rata de participare a membrilor CRD: 56,25%.

ELABORAT:

Oxana Cazacu, șef secție politici regionale și cooperare externă

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte

Olga Zlati, șef secție finanțe și achiziții

COORDONAT:

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională





