



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud




MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Aprobat: _____
Nicolae HRISTOV
Director ADR Sud
„_____” _____ 2024

Coordonat: _____
Ana MARDARE
Secretar de Stat MIDR
„_____” _____ 2024

RAPORT de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru Trimestrul II anul 2024

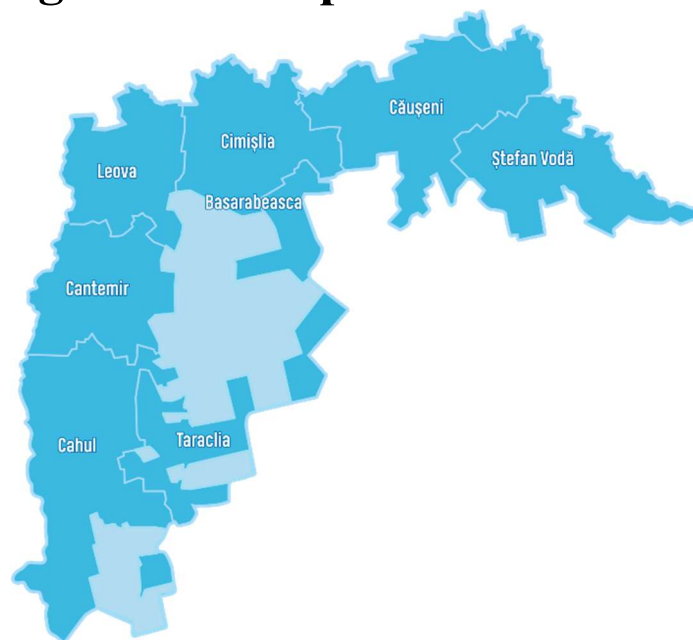

Cimișlia 2024

Indicatori de performanță				
Domeniu	Denumire indicator	Valoare de referință 2023	Valoare țintă	Grad de realizare
Performanță și eficiență	Numărul proiectelor de dezvoltare regională implementate (<i>nr./%</i>)	6	13	1
	Populația cu acces la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare construite/reabilitate (<i>nr./%</i>)	18492	28036	19 917/ 71,04
	Numărul de proiecte atrase	-	2	-
	Numărul de noi documente elaborate (studii, ghiduri etc.)	-	1	-
	Numărul de parteneriate stabilite	-	1	-
Politici publice	Gradul de implementare a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program, (%)	40,0	100,0	53,14
	Rata de implementare a Programului Operațional Regional (POR) , (%)	42,4	66,9	49,84
	Rata de participare a membrilor CRD la ședințele organizate, (%)	50,0	55,0	84,6
	Rata de implementare a Planului de acțiuni al instituției, (%)	66,7	89,0	71,5
Management instituțional	Gradul de valorificare a bugetului anual preconizat pentru proiecte, (%)	155,49	100,0	79,70
	Gradul de asigurare cu personal, (%)	62,5	82,5	76,32
	Rata fluctuației personalului din cadrul instituției publice, (%)	38,46	16,67	-
	Ponderea angajaților instruiți, (%)	0	50,0	66,67
	Nivelul de transparență a activității, inclusiv financiară	90	100	
	Audiența atinsă prin acțiunile de promovare, informare, comunicare în domeniul de activitate al autorității (<i>nr. vizualizărilor, aprecierilor, urmărilor, beneficiarilor de programe/activități etc. /%</i>)	150108	160000	66 318 / 41,45
	- Număr de vizitatorilor unici ai paginii web / %	10800	12800	105 677/ 825,60
	- impactul postărilor (<i>nr. vizualizărilor spoturilor video și nr. aprecierilor postărilor /%</i>)	74400	84400	41 284 / 48,91

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Obiectiv 1: ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact							
<ul style="list-style-type: none"> - 1 studiu de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud elaborat; - 4 ședințe ale Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud desfășurate. 							
1.	Implementarea politicii de dezvoltare urbană (centrele urbane și orașele poli de creștere)	Nr. consultări oferite APL aferente elaborării/actualizării Programelor de Revitalizare Urbană; Nr. consultări oferite mun. Cahul în implementarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în RM 2021-2027	01.01.2024 - 31.12.2024	Secția planificare și cooperare regională Secția managementul integrat al proiectelor Secția monitorizare și evaluare	Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: - 2 consultări oferite primăriei or. Căușeni cu privire la actualizarea PRU; - 1 Plan de acțiuni ADR Sud-UIP Cahul pentru implementarea PNDOPC, Etapa I, 2024 aprobat;	17,27
2.	Actualizarea componentei Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	1 concurs public organizat și desfășurat Componenta CRD Sud actualizată	02.01.2024 - 09.02.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat: - Lista componentei CRD Sud de legislatura a IV-a recepționată de la MIDR; - Participanții la concurs informați cu privire la rezultatele obținute.	11,22
3.	Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud	4 ședințe organizate și desfășurate 4 procese-verbale întocmite Nr. decizii aprobate	01.02.2024 - 31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 ședință extraordinară organizată și desfășurată; - 1 proces-verbal întocmit;	11,45

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 5 decizii aprobate.	
4.	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. participări ședințe Nr. proiecte de documente consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR	Șef SPCR	În curs de realizare: - În perioada de referință, Agenția nu a recepționat nici o solicitare de implicare în activitatea Grupului național de lucru pe domeniu.	0
5.	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente domeniilor de intervenție ale politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte câștigate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 3 Cereri complete de finanțare elaborate și depuse în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă, cu finanțare din sursele FNDRL.	8,60
6.	Participarea la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente implementării politicii de dezvoltare regională	Nr. proiecte de hotărâri de guvern consultate Nr. propuneri înaintate	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: În perioada de referință, Agenția nu a recepționat nici o solicitare de participare la consultările publice privind elaborarea, modificarea unor hotărâri ale Guvernului aferente	0,00

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						implementării politicii de dezvoltare regională.	
7.	Elaborarea studiului de specializare inteligentă a RDS	1 studiu elaborat	01.07.2023-31.03.2024	SPCR SME	Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: - 1 scrisoare elaborată și remisă în adresa MIDR cu privire la adresarea către GIZ Moldova de a urgenta achiziția de contractare a serviciilor de elaborare a Studiului de specializare inteligentă al RD Sud; - La data de 14.06.2024, GIZ Moldova a publicat anunțul de achiziții a experților pentru elaborarea Studiilor de specializare inteligentă a RD Sud și UTA Găgăuzia.	3,21
8.	Facilitarea de către ADR Sud a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv co-finanțări) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. consultări oferite actorilor regionali 1 parteneriat stabilit/facilitat	02.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud SPCR/SME	Șef SPCR Specialist în planificare Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 propunere de implicare a ADR Sud, la solicitarea CR Taraclia, în calitate de Partener strategic asociat în cadrul a 1 proiect aferent Programului Interreg NEXT Regiunea	3,59

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
					Șef SMIP Șef SME	Dunărea 2021-2027 examinată; - 1 solicitare de expunere a acceptului/refuzului remisă în adresa MIDR; - 1 recomandare cu privire la stabilirea parteneriatului remisă în adresa CR; - 2 scrisori remise în adresa APL II din RD Sud cu privire la diseminarea informației către APL I cu privire la posibilitatea de participare în cadrul apelurilor lansate aferente programelor de cooperare transnațională; - 1 mesaj remis în adresa APL urbane cu privire la oportunitatea de alăturare la dezvoltarea unei idei de proiect în cadrul Programului Interreg Europe în domeniul îmbunătățirii politicilor de logistică urbană;	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<ul style="list-style-type: none"> - 1 informație prezentată la solicitarea Guvernului cu privire la 3 proiecte de anvergură în RD Sud fără acoperire financiară care urmează a fi negociate cu comunitatea partenerilor de dezvoltare; - 1 ședință de discuții cu reprezentanții Băncii germane de dezvoltare KfW cu privire la implementarea „Programului deschis de dezvoltare urbană” în RM; - 1 chestionar completat și remis în adresa KfW; - 1 notificare remisă către primarii orașelor din RDS ce dețin Programe de revitalizare urbană valide cu privire la posibilitatea de accesare a fondurilor oferite de către SFPL în RM; - 2 consultări oferite APL cu privire la modalitățile de identificare a 	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						partenerilor în cadrul Programelor de cooperare.	
9.	Cartografierea anuală a proiectelor implementate în RDS cu suportul partenerilor de dezvoltare	Nr. proiecte cartografiate 1 bază de date regională și actualizată	01.05.2024- 28.06.2024	SME/SPCR	Șef SME Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: - 1 tabel și 1 instrucțiune de completare a tabelului elaborate; - 8 scrisori remise în adresa APL II și 1 scrisoare remisă către Primăria mun. Cahul.	4,90
10.	Organizarea/facilitarea evenimentelor de promovare a potențialului economic, turistic și investițional al RD Sud	Nr. evenimente organizate/facilitate 60 participanți la evenimente	01.05.2024- 31.10.2024	SPCR/SMIP/ SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Neinițiat: - Activitatea urmează a fi realizată în perioada trimestrului IV.	0
11.	Elaborarea Planului anual de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 și prezentarea spre aprobare CRD Sud	1 plan anual de implementare a POR Sud 2022-2024 elaborat și aprobat	02.01.2024- 31.03.2024	SPCR/SMIP/ SME	Șef SPCR Șef SMIP	Realizat: - Planul de implementare a POR Sud 2022-2024 pentru anul de referință 2024 a fost prezentat și aprobat de către CRD Sud la ședința din data de 18.04.2024.	9,81
12	Actualizarea Planului de implementarea a POR Sud 2022-2024 și prezentarea spre aprobate CRD Sud	1 plan de implementare a POR Sud 2022-2024 actualizat și aprobat	03.06.2024- 30.08.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în planificare	În curs de realizare: - Activitatea va fi realizată urmare a desfășurării Concursului de selectare a proiectelor de	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						aprovizionare cu apă și sanitație, Programul de dezvoltare regională, Apel pe listă.	
14.	Actualizarea Programului Regional Sectorial privind sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Sud	1 raport de evaluare a PRS elaborat 3 ședințe ale grupului de lucru organizate Actualizarea PRS privind sporirea atractivității turistice a RDS inițiată	01.05.2024-31.12.2024	SME SPCR	Șef SME Specialist în monitorizare și evaluare Șef SPCR Specialist în planificare	Neinițiat: Această activitate nu a fost inițiată din cauza lipsei de cadre în agenție.	0
Obiectiv 2: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - cca 10 000 de locuitori ai zonelor neiluminate; - 3 obiective turistice amenajate; - 2 obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice; - 33 localități ce au acces la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare; - 28036 persoane cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare.							
Direcția prioritară 1.1. CONSOLIDAREA ROLULUI ȘI FUNCȚIILOR ORAȘELOR ÎN SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	5 Contracte de finanțare semnate	17.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada în trimestrul I	0
2	Organizarea procedurilor de achiziții publice	4 anunțuri de intenții incluse în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	21.11.2023-01.07.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada în trimestrul I	0
		4 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	15.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: - 1 anunț de participare privind achiziționarea	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						lucrărilor în perioada lunii aprilie	
		4 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	28.12.2023-01.03.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada în trimestrul I	0
		1 procedură de achiziții publice desfășurată pentru servicii de responsabil tehnic LP, 3 prin COP		SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada în trimestrul I	0,31
		8 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	15.12.2023-01.03.2024			Realizat - 8 decizii GLAP de atribuire a contractelor de antrepriză și responsabil tehnic.	0,31
		8 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				Realizat - 8 dări de seamă atribuire a contractelor de antrepriză și responsabil tehnic.	0,31
3.	Semnarea contractelor de antrepriză servicii	8 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.03.2024-01.08.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs realizare: - 4 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate; - 2 contracte au fost semnate în tem. Legii 131/2015, Autoritatea Contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic	9,84

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						dacă valoarea viitorului contract pentru servicii nu depășește suma de 150 000 fără TVA.	
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	11 vizite de monitorizare desfășurate 11 ședințe desfășurate 1 zonă de recreere 2 atracții turistice amenajate 17 ha de teritoriu amenajat 10 ecosfere create 4 poduri construite cu specific de arhitectură medievală 610 m de albia râului curățită și pavată 1 parcare pentru automobile 3 instituții publice renovare 9 terenuri de joacă aferente grădiniței de copii amenajate și asigurate cu echipament pentru organizarea activităților în aer liber 88,8 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizate 765 piloni montați 2397 de corpuri de iluminat LED instalate	01.04.2024-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 3 declanșări a lucrărilor de construcție; - 3 vizite de monitorizare; - 7 ședințe de lucru organizată; - 53 % clopotniță germană reconstruită; - 4,7 % de pavaj pietonal.	5,74

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
Direcția prioritară 2.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ DIN REGIUNE							
1.	Încheierea contractelor de finanțare	7 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrului I.	0
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.03.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat: În perioada trimestrului I.	0
		2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor				În curs de realizare: La data de 23.02.2024 a fost publicat 1 anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor.	0
		2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md				În curs de realizare: La data de 23.02.2024 a fost publicat 1 anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor.	0
		2 proceduri de achiziții publice desfășurate				Realizat: În perioada trimestrului I	0
		2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - Decizia de atribuire lucrări nr.17/24 din 27.05.2024 (1 contestație la ANSC a deciziei GLAP de atribuire (lucrări). - Decizia de atribuire SRT nr.16/24 din 15.05.2024.	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP				În curs de realizare: - 1 dare de seamă la data de 04.06.2024 a fost prezentată către ADR (RT).	0,05
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	14 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	01.07.2022-31.12.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs de realizare: - 1 contract pentru RT a fost semnat la 29.05.2024.	0
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	15 vizite de monitorizare desfășurate 12 ședințe desfășurate 71,1 km rețele de apeduct magistral construit 89,2 km rețele de apeduct interne 11 Rezervoare de apă construite 6 stații de pompare a apei construite 16 stații de clorinare cu hipoclorit de sodiu construite 1 stație de epurare modernizată 49,8 km rețele de canalizare construite 8 stații de pompare a apelor uzate construite 1 documentație de proiect	01.09.2022-31.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 13 vizite de monitorizare; - 13 ședințe de lucru organizate; - 5634 m.l. rețele apeducte interioare; - 21280 m.l. de rețele de apeducte magistrale; - 2 rezervoare de apă (castele) X 50 m3 construite; - 7 SPAU – 82,6 %; - 46,7 % de modernizare a SEAU; - 3762 m.l. de rețea de canalizare	0

Direcția prioritară 2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SUPT PENTRU AFACERI

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
1.	Încheierea contractelor de finanțare	2 Contracte de finanțare semnate	01.03.2022-17.11.2023	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat În perioada trimestrului I	0
2.	Organizarea procedurilor de achiziții publice	1 anunț de intenții inclus în planul de achiziții al ADR Sud elaborat și prezentat către AAP, spre publicare în BAP	01.04.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	Realizat În perioada trimestrului I	0
2 anunțuri de participare privind achiziționarea lucrărilor	Realizat În perioada trimestrului I						
2 anunțuri de participare pentru serviciile de responsabil tehnic, elaborate și publicate pe platforma www.achizitii.md	Realizat: În tem. Legii 131/2015, Autoritatea Contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic dacă valoarea viitorului contract pentru servicii nu depășește suma de 150 000 fără TVA.						
2 proceduri de achiziții publice desfășurate	Realizat În perioada trimestrului I						
2 decizii ale grupului de lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții elaborate și prezentate către AAP	Realizat În perioada trimestrului I						
2 dări de seamă lucru privind rezultatele procedurilor de achiziții	În curs de realizare: La data de 08.05.2024 a fost semnat Darea de samă	0					

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
		elaborate și prezentate către AAP				în tem. Legii 131/2015, Autoritatea Contractantă are dreptul să încheie contracte directe cu operatorul economic dacă valoarea viitorului contract pentru servicii nu depășește suma de 150 000 fără TVA.	
3.	Semnarea contractelor de antrepriză/servicii	6 contracte de lucrări, bunuri și servicii încheiate	15.08.2022-01.09.2024	SMIP	Specialist în achiziții publice	În curs de realizare - la data de 07.05.2024 a fost semnat Contractul de antrepriza. - la data de 10.05.2024 a fost semnat contract cu RT.	0
4.	Implementarea proiectelor incluse în DUP 2022-2024 aprobate spre finanțare	4 vizite de monitorizare desfășurate 4 ședințe desfășurate 2,4 km de rețele electrice de tensiune înaltă 1,41 km rețele de apeduct 1,58 km rețele de canalizare 0,87 km rețele de gaze naturale construcția halei de producere cu suprafața totală de 1191 m2 0,39 ha amenajarea terenului adiacent	12.09.2022-05.12.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	În curs de realizare: - 5 vizite de monitorizare; - 4 ședințe de lucru organizate; - 30 % din hala multifuncțională de producere.	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
5.	Recepționarea lucrărilor de construcție și a instalațiilor aferente acestora	1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	05.12.2023-01.04.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizarea proiectelor	Realizat: În perioada trimestrului I	0
6.	Transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării	1 act de predare-primire semnat 1 raport elaborat și transmis în termen	01.04.2024-01.06.2024	SMIP	Șef SMIP Specialist în monitorizare a proiectelor	În curs de realizare: - 1 act de predare-primire elaborat la 97 %; - 1 raport final elaborat la 97 %.	61,13

Obiectiv 3: ASIGURAREA MANAGEMENTULUI ADMINISTRATIV-FINANCIAR ȘI DE COMUNICARE AL INSTITUȚIEI

Indicatori de impact

- Executarea devizului anual de venituri și cheltuieli;
- Majorarea gradului de asigurare cu personal a instituției;
- Reducerea ratei fluctuației personalului din cadrul instituției;
- Majorarea ponderii concursurilor finalizate cu succes în totalul concursurilor organizate;
- Creșterea fondului de cheltuieli alocate pentru formarea profesională per salariat în ADR;
- 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat;
- 1 registru al riscurilor elaborat;
- Majorarea gradului de transparență a activității Agenției.

1	Monitorizarea și asigurarea executării bugetului operațional pentru anul de gestiune și rectificare la necesitate.	1 deviz anual de venituri și cheltuieli executat Nr. de rectificări la devizul anual de venituri și cheltuieli operate Nr. solicitărilor de plată executate Nr. ordinelor de plată executate	02.01.2024-30.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	În curs de realizare: Pentru perioada de raportare au fost desfășurate următoarele acțiuni: - monitorizarea lunară a devizul anual de venituri și cheltuieli;	41,73
---	--	---	-----------------------	----	-------------------------------------	--	-------

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<ul style="list-style-type: none"> - 1 rectificare devizului anual de venituri și cheltuieli efectuată, conform deciziei CNCDDL nr. 11/24 din 21.06.2024; - 26 solicitări de plată pentru cheltuieli operaționale și proiecte investiționale; - 90 ordine de plată executate. 	
2	Raportarea gradului de executare a bugetului operațional și prezentarea rapoartelor aferente instituțiilor abilitate și partenerilor de dezvoltare	Nr. rapoartelor (lunare, trimestriale, semestriale, anuale)	25.01.2024-25.12.2024	SA	Șef SA/Contabil-șef Contabil	<p>În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost prezentate următoarele rapoarte:</p> <p>Lunare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 rapoarte privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (IPC 21); - 3 rapoarte cu privire la evidența utilizării de către ADR Sud a autovehiculelor; <p>Trimestriale:</p>	41,73

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 1 raport cu privire la investiții (2-INV); - 1 raport cu privire la câștigurile salariale (Munca 1); - 1 raport cu privire la costurile și cheltuielile entității (5-CI-23); - 1 raport cu privire la Import/Export de servicii (EI-7/8). Anuale: - 1 raport cu privire la Situații Financiare pentru anul 2023 (RSF1 21).	
6.	Elaborarea Planului anual de instruire al ADR pentru anul 2024	1 plan anual de instruire elaborat	02.01.2024-31.01.2024	SA/SPCR/SMI P/SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizată: Activitatea a fost realizată în trimestrul I.	0
7.	Recrutarea personalului și administrarea documentației aferente	Nr. anunțuri plasate Nr. concursuri desfășurate Nr. persoane angajate Nr. documentație de personal elaborate și completate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare: 1 anunț privind lansarea concursului pentru ocuparea funcției vacante plasat la data de 27.06.2024.	19,65
8.	Elaborarea actelor administrative referitoare la personal și activitatea de bază	Nr. ordine semnate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost elaborate și semnate:	14,74

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						- 25 ordine cu privire la personal; - 17 ordine cu privire la activitatea de bază.	
9.	Elaborarea nomenclatorului și arhivarea dosarelor	Nomenclatorul dosarelor pentru anul 2024 elaborat și aprobat	02.01.2024-31.01.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	Realizată: Activitatea a fost realizată în trimestrul I.	0
10.	Gestionarea și menținerea sistemului general de evidență a corespondenței	Nr. scrisori de intrare Nr. scrisori de ieșire	01.01.2024-31.12.2024	SA	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare: Pentru perioada de referință au fost înregistrate: - 397 scrisori de intrare; - 273 scrisori de ieșire.	14,74
11.	Implementarea sistemului de control intern managerial	1 declarație anuală privind CIM completată și publicată 1 raport privind implementarea planului anual CIM elaborat și publicat 1 registru al riscurilor elaborat	02.01.2024-15.02.2024	SA	Jurist	Realizat: - Activitate realizată în trimestrul I.	0
12.	Reprezentarea instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept	Nr. reprezentări a instituției în instanțele de judecată, control sau organele de drept Nr. scrisori elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	În curs de realizare - 1ședință în cadrul Curții de Apel Comrat în cauza Zlati Olga vs ADR Sud; - 1 reprezentare la CNA Cahul pe marginea cauzei de fraudă sesizată față de SRL„Seralcon”;	24,48

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<ul style="list-style-type: none"> - 1 Reprezentarea ADR Sud în cadrul IGP Cimișlia; - 1 Reprezentarea ADR Sud în cadrul IGP Chișinău; - 1 demers către Inspectoratul Control Financiar de Stat; - 1 ședință ANSC; - 2 solicitări către Agenția Achiziții Publice; - 17 scrisori elaborate (CNA, MIDR, Achiziții Publice etc); - 1 cerere către ASP Cimișlia privind perfectarea Extrasului ADR Sud; - 1 Cerere de recurs în cadrul CSJ cauza Zlati Olga vs ADR Sud. 	
13.	Examinarea primară a proiectelor de acte juridice civile prezentate spre semnare ADR Sud care dau naștere, modifică sau încetează raporturile juridice civile dintre	Nr. acte examinate Nr. notelor informative elaborate	02.01.2024-31.12.2024	SA	Jurist	<p>În curs de realizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 contracte de antrepriză examinate; - 6 contracte de depozit garanție de bună execuție examinate; - 1 contract de prestări servicii de acces și 	24,48

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	părțile contractante în măsura delegării lor de către ADR Sud					actualizare a produsului softaw are „e-Administrare. - 1 contract de prestări servicii de locațiune; - 2 puncte de vedere examinate în cadrul ședințelor ANSC. - 1 memorandum de colaborare; - 1 acord adițional de modificarea clauzelor contractuale. - 1 demers către Agenția Achiziții Publice privind includerea în lista de interdicție a operatorului economic.	
14.	Asigurarea transparenței și vizibilității activității ADR Sud	Nr. materiale, comunicate de presă, anunțuri publicate Nr. vizualizări	01.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME/SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 41 publicații „Noutăți” pe www.adrsud.md – 25034 vizualizări; - 5 publicații „Finanțare”; - 44 publicații Facebook – 40 195 impact ale postărilor, 8354 interacțiuni cu postările; - 11 articole redistribuite	17,09

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						Facebook – 1089 impact ale postărilor, 108 interacțiuni cu postările; - 34 publicații LinkedIn - 34 publicații canal Telegram - 2 intervenții Media Locală - Rubricile: CRD Sud, lista proiectelor, poze rulante, rapoarte, planuri actualizate pe site-ul Agenției; - 1 eveniment cu privire la lansarea lucrărilor de construcție a un proiect organizat.	
15.	Elaborarea materialelor promoționale cu privire la potențialul de dezvoltare al RDS	Nr. broșuri editate	02.05.2024-31.12.2024	SPCR SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: În perioada respectivă a fost elaborat conținutul unui pliant și examinate oferte de preț ale companiilor de machetare a materialelor promoționale.	10,04
16.	Promovarea politicii de dezvoltare regională și activității ADR Sud în	5 intervenții media	01.01.2024-31.12.2024	Director ADR Sud	Șef SPCR	În curs de realizare: - 2 intervenții media realizate prin intermediul	4,71

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	mijloacele mass-media la nivel regional și local				Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	postului local de televiziune Media TV Cimișlia și 2 publicații în Ziarul Cim Prim.	
Obiectiv 4: ASIGURAREA PROCESULUI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR ȘI POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE							
Indicatori de impact							
- Majorarea numărului de proiecte monitorizate post-implementare.							
1.	Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate	4 planuri de durabilitate elaborate/aprobate 2 note informative cu privire la evaluarea proiectelor de dezvoltare regională 2 vizite post implementare a proiectele finisate	01.03.2024-31.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	În curs de realizare -1 plan de durabilitate în așteptarea aprobării de consiliul local în cadrul proiectului „Dezvoltarea durabilă ca structură de sprijin a afacerilor de importanță regională”	2,88
2.	Activități de evaluare a proiectelor	2 rapoarte post implementare elaborate 4 vizite de monitorizare a proiectelor implementate	01.03.2024-15.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	În curs de realizare -1 raport de evaluare post-implementare a proiectului „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova”; - 4 vizite post implementare desfășurate.	29,95
3.	Activități de monitorizare a proiectelor de	20 vizite de monitorizare în teritoriu efectuate 20 fișe de observație elaborate	01.03.2024-31.12.2024	SME/ SMIP	Șef SME	În curs de realizare Pentru perioada respectivă au fost efectuate 8 vizite	5,76

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	dezvoltare regională în curs de implementare					de monitorizare și evaluare 8 fișe de observație.	
4.	Elaborarea raportului cu privire la implementarea POR Sud 2022-2024	1 raport semestrial elaborat 1 raport anual elaborat	20.05.2024- 15.01.2025	SME/SMIP/ SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare A fost inițiat raportul semestrial cu privire la implementarea POR Sud 2022-2024	21,89
5.	Elaborarea raportului trimestrial și anual privind activitatea ADR Sud în anul 2024	5 rapoarte elaborate	01.03.2024- 15.01.2025	SME/SMIP/ SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare În perioada de referință a fost elaborat raportul privind realizarea planului de activitate pentru trimestrul II anul 2024.	2,76
6.	Elaborarea raportului semestrial și anual aferent implementării PNDOPC 2021-2027	2 rapoarte	02.01.2024- 20.01.2025	SME/SMIP/ SPCR/SA	Șef SME	În curs de realizare A fost inițiat raportul semestrial privind implementării PNDOPC 2021-2027.	5,76
Obiectiv 5:CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ANGAJAȚILOR ADR ȘI A ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ							
Indicatori de impact - 4 angajați instruiți.							
1.	Formarea continuă a specialiștilor ADR Sud	Nr. participanți la instruirii Nr. instruirii organizate	02.01.2024- 31.12.2024	SA SPCR/SMIP/ SME	Manager de oficiu/ Specialist în resurse umane	În curs de realizare - 10 angajați instruiți; - 6 instruirii organizate: - Participare în cadrul instruirii organizate de TESIM „Go4Cooperation Week”	0,82

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						<p>(aprilie - 1 angajat instruit);</p> <p>- Workshop de Consultări privind Conceptul de Training pentru autoritățile publice locale (APL) în domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor (25.04.2024 – 3 angajați instruiți);</p> <p>- Atelier de instruire în domeniul achizițiilor publice (25.04.2024 – 1 angajat instruit);</p> <p>- Webinar cu genericul „Legislația muncii: aspectele anului 2024. Discuții” (02.05.2024 – 4 angajați instruiți);</p> <p>- Sesiune de instruire privind al apelul II de proiecte din cadrul Programului Interreg Bazinul Mării Negre 2021-2027 (23.04.2024 – 1 angajat instruit);</p> <p>-ODP: 5th Deliverable - Training Concept for</p>	

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						LPAș (10.06.2024 – 5 angajați instruiți).	
2.	Facilitarea/organizarea instruirilor pentru APL și alți actori regionali în domeniile aferente politicii de dezvoltare regională	Nr. instruiți facilitate/organizate	02.01.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Contabil Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	În curs de realizare: - 1 atelier de instruire pentru membrii CRD Sud organizat și desfășurat la data de 19.06.2024 cu privire la cadrul normativ și instituțional de implementare a politicii naționale de dezvoltare regională.	3,90
3.	Organizarea instruirilor aferente apelurilor competitive de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDRL	Nr. sesiuni de instruire organizate Nr. consultări oferite Nr. cereri de finanțare recepționate	01.03.2024-31.12.2024	SPCR/SMIP/SME	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Neinițiat: - Activitatea va fi realizată urmare a lansării de către MIDR a apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională.	0
4.	Facilitarea organizării și participarea în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici și transfer de know-how	Nr. vizite de studiu efectuate Nr. beneficiari	01.03.2024-31.12.2024	SPCR SMIP SME SA	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Neinițiat: - În perioada de referință, Agenția nu a facilitat organizarea / participat în cadrul vizitelor de studiu în vederea preluării bunelor practici	0

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	în domeniul dezvoltării regionale					și transfer de know-how în domeniul dezvoltării regionale.	
Activități complementare							
1.	Elaborarea rapoartelor trimestriale de activitate al secțiilor din cadrul agenției pentru anul 2024	Nr. rapoarte elaborate	20.03.2024 30.01.2025	SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME Șef SA	Realizat: - 4 Rapoarte trimestriale elaborate.	în limita bugetului aprobat
2.	Audieri publice în cadrul comisiei administrație publică și dezvoltarea regională cu privire la activitatea Agențiilor de Dezvoltare Regională		21 mai 2024	ADR Sud	Director ADR Sud Șef SPCR Șef SMIP	Realizat: - 1 prezentare cu privire la activitatea SPCR în perioada 2022-2024 elaborată; - 1 prezentare cu privire la activitatea SMIP în perioada 2022-2024 elaborată; - 1 participare la ședința de audieri publice cu privire la activitatea ADR.	în limita bugetului aprobat
3.	Participarea în cadrul sesiunilor de informare cu privire la noile Programe de cooperare	Nr. participări	09.04.2024 23.05.2024	SPCR	Șef SPCR Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD	Realizat: - 2 participări la sesiunile de instruire aferente Programelor de cooperare Interreg NEXT 2021-2027.	în limita bugetului aprobat
4.	Conceptul de Training pentru autoritățile publice locale (APL) în	Nr. participări Nr documente examinate		ADR Sud	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: - 1 participare la atelierul de consultări privind	În limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor					conceptul de training pentru APL în domeniul dezvoltării și managementului integrat al proiectelor; -1 participare la ședința de lucru cu privire la agrearea foii de parcurs aferente; - 3 documente examinate cu remiterea propunerilor de ajustare.	
5.	Participare în cadrul Grupului sectorial de lucru 22 Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale	Nr. participări ședințe Nr. documente examinate	13.04.2024-31.05.2024	Director ADR Sud	Director ADR Sud Șef SPCR	În curs de realizare: -1 participare la atelierul de lucru dedicat pregătirilor pentru Reuniunile de Screening Bilateral; - 1 ședința Grupului de Lucru pentru Capitolul 22: Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale.	în limita bugetului aprobat
6.	Examinare și elaborarea avizelor Agenției în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru identificarea, evaluarea	Nr. cereri de finanțare examinate Nr. avize elaborate	05.04.2024	SMIP SPCR	Șef SPCR Șef SMIP Șef SME	În curs de realizare: - 131 cereri de finanțare examinate; - 131 de avize elaborate și remise în adresa ONDRL.	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
	și aprobarea proiectelor în domeniul dezvoltării locale (pct. 28, alin. 3), lit. d) din Anexa nr. 3 la HG nr. 152/2022)						
7.	Coordonarea stagiului de practică		29.04.2024-19.05.2024	SPCR	Șef SPCR	Realizat: - Examinarea actelor recepționate de la Universitatea de Stat din RM, facultatea Relații Internaționale; - Elaborarea Planului tematic și a conținuturilor activităților practicii de producție a studentului în anul II; - Coordonarea realizării activităților stabilite cu oferirea explicațiilor de rigoare.	în limita bugetului aprobat
8.	Implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă și sanitație în r-l Cahul” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei prin intermediul băncii KfW	Nr. raport elaborat și remis în adresa KfW Nr. de ședințe Nr. de vizite Nr. publicații	15.01.2024-31.12.2024	SMIP SME SA	Șef SMIP Șef SME Șef SA Specialist în monitorizarea proiectelor Specialist în achiziții Jurist	În curs de realizare: - 1 eveniment de lansare proiectului; - 4 vizite de monitorizare desfășurate; - 9 ședințe desfășurate; - 29,0 km rețea de canalizare construit inclusiv 13,06 km în trimestrul II, anul 2024;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
					Specialist în comunicare și relații APL/CRD	- 72,3 % de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate; - 1,3 km apeduct magistral (priza de captare a apei-stația de tratare Cahul); - cooperarea în vederea actualizării paginii proiectului pe site, 4 publicații FB.	
9.	Desfășurarea Misiunea de evaluare finală cu experți contractați de Delegația UE în Republica Moldova în cadrul proiectelor „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare , precum și de eficiență energetică în clădirile publice” implementate in Regiunea de Dezvoltare Sud.	Nr. de ședințe Nr. de vizite post implementare	04-06.06.2024	SMIP SME	SMIP SME	Realizat - 4 ședințe desfășurate; - 4 obiecte vizitate post implementare.	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
10.	Instruire cu Compania responsabilă de dezvoltarea sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală.	Nr de instruiți Baza de date completată	11.04.2024-31.12.2024	SMIP SME	SMIP SME	În curs de realizare - 2 instruiți; - 1 bază de date completată cu datele din RD Sud pentru elaborarea și dezvoltarea Sistemului informațional.	în limita bugetului aprobat
11.	Realizarea activităților în contextul celebrării Zilei Europei	Nr participări la evenimente Nr comunicate/ infografice Nr de spoturi video realizate	09.05.2024-31.05.2024	SPCR	Director ADR Sud Specialist în comunicare și relații APL/CRD	Realizat: - participarea la celebrarea Zilei Europei în PMAN; - 1 infografic despre realizările ADR Sud din surse UE machetat; - 5 articole tematice diseminate; - oferirea suportului MIDR la realizarea unui spot video cu beneficiarii unui proiect AAC finanțat din surse UE; - 2 spoturi video despre proiectele de EE finanțate din surse UE elaborate și diseminate.	în limita bugetului aprobat
12.	Executarea materialelor promoționale/panouri informative	Nr oferte de preț examinate Nr articole machetate	15.06.2024-30.06.2024	SPCR	Specialist în comunicare și relații APL/CRD	În curs de realizare - examinat necesarul de materiale promoționale, ofertelor de preț pentru 2 companii;	în limita bugetului aprobat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Perioada de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil	Gradul de realizare: - <i>Neinițiată</i> ; - <i>În curs de realizare</i> ; - <i>Realizată</i> . (descrierea succintă)	Costul realizării
						-1 plăcuță exterior machetată; - inițierea elaborării panourilor informative pentru 4 proiecte.	

TOTAL – 59 acțiuni, dintre care:	Neinițiate	În curs de realizare	Realizate
Trimestru I			
Trimestru II	4	36	3
Trimestru III			
Trimestru IV			

ELABORAT:

Șefa SPCR Irina COROIAN _____

Șef SMIP Andrei POPUȘOI _____

Șefa SA Oxana GRAUR _____

Șefa SME Olga DIACONU _____

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională și locală

Igor MALAI _____

Șef adjunct direcție, Șef secție programe de dezvoltare regională și locală

Denis LUNGUL _____
