




MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

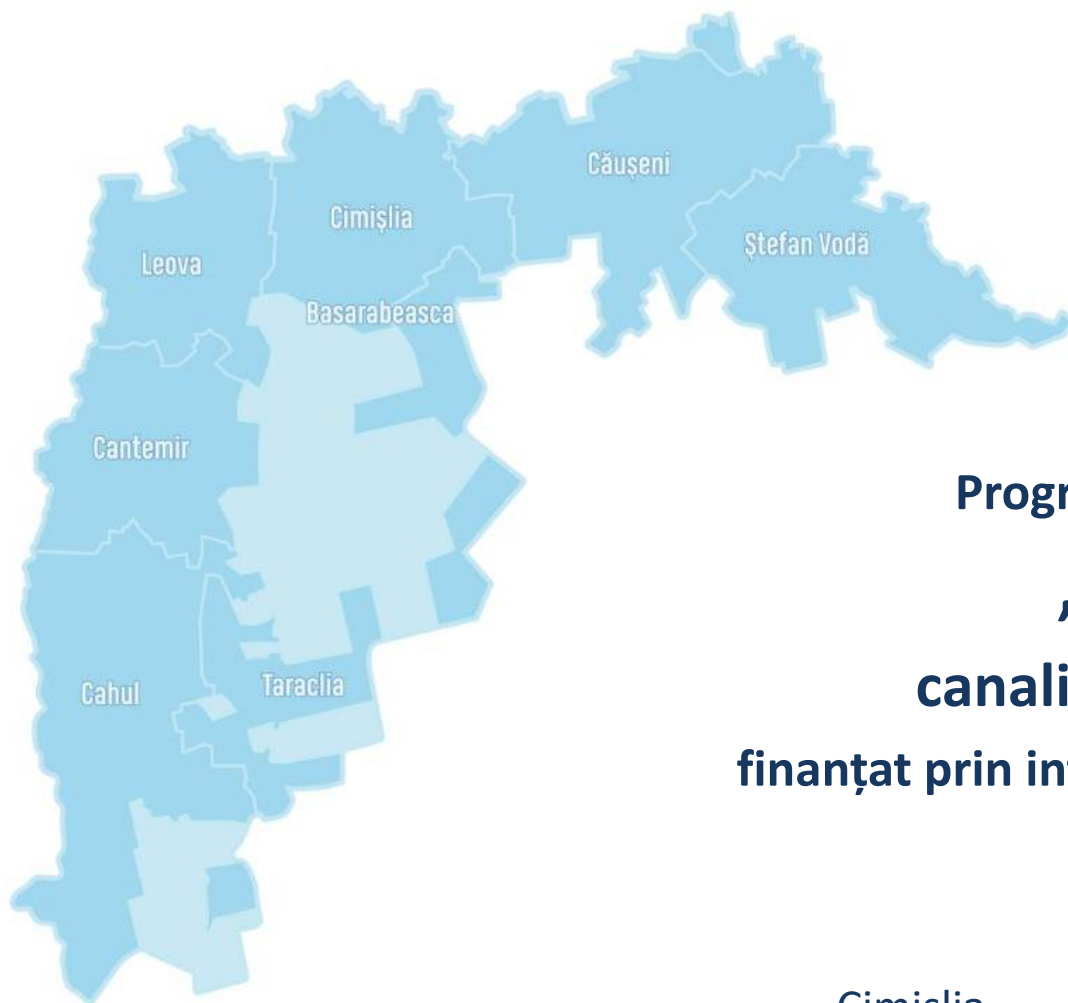

**Progresul implementării proiectului
„Aprovizionarea cu apă și
canalizare în municipiul Cahul”,
finanțat prin intermediul băncii germane KfW**


Cimișlia,
26 iulie 2024



Proiectul este implementat grație suportului financiar oferit de către Guvernul Germaniei și Comisia Europeană prin Banca Germană de Dezvoltare „KfW”, conform acordului cu Guvernul Republicii Moldova.

Suportul financiar este oferit sub formă grant în mărime de 46,4 mln EUR, din care 33,5 mln EUR – de Guvernul Germaniei și 12,9 mln EUR de UE.

Distribuția Suportului Financiar pentru Proiect





Atribuțiile ADR Sud aferente implementării proiectului „Aprovizionarea cu apă și canalizare în municipiul Cahul”.

Atribuțiile ADR Sud sunt indicate în Acordul adițional cvadripartit din 25.05.2023 semnat de KfW, primăria municipiului Cahul, ADR Sud și MIDR.

Participarea generală la grupul de lucru al PEA;

- participarea la ședințele de două ori pe lună convocate și desfășurate de AEP I;
- participarea la ședința comitetului director;
- elaborează rapoarte narrative.

Participarea la achizițiile publice de lucrări;

Verificarea facturilor pentru lucrările de construcții și semnarea lor;

Atribuții suplimentare:

- Organizarea de acțiuni de PR și de vizibilitate la nivel regional.
- Informarea Consiliului Regional de Dezvoltare Sud privitor la activitățile desfășurate în cadrul proiectului



Obiectivele Proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Cahul, Cotihana și Crihana Veche prin acces sigur la servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Stadiul Proiectului:

Lucrările de construcție au început în mai 2023.

Structura de Management a Proiectului:


KfW ca reprezentant al Autorităților Finanțatoare (Guvernul Germaniei și Delegația UE); Primăria Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud ca Agenții de Execuție a Proiectului; Apa-Canal Cahul ca Operator de Servicii.



FINANȚARE:

Guvernul Germaniei susține 3 componente ale Proiectului:

1. Alimentarea cu apă potabilă și evacuarea apelor uzate în raionul Cahul (22,0 mln EUR);
2. Programul de Sanitație Cahul (10,0 mln EUR);
3. Măsuri auxiliare (1,5 mln EUR).

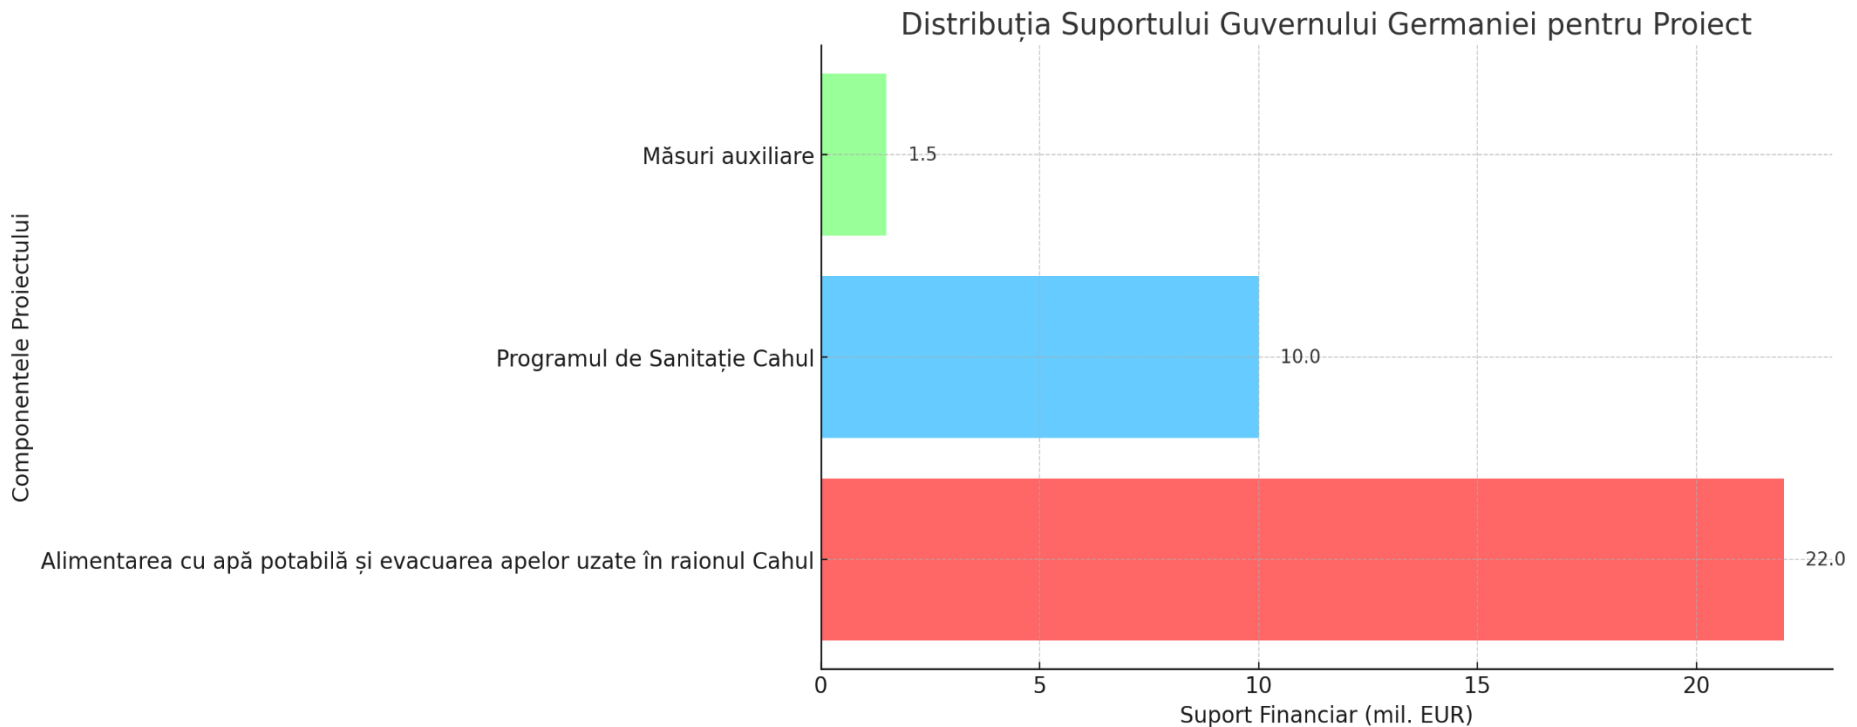


Proiectul „Aprovizionarea cu apă și canalizare în municipiul Cahul”



FINANȚARE:

Comisia Europeană susține 2 componente ale Proiectului:

1. Extinderea rețelei de apa in Cahul si satele din jur și alte investitii (10,124 mln EUR);
2. Extinderea rețelei de canalizare in Cahul. Sistem de contorizare la distanta. (2,776 mln EUR).

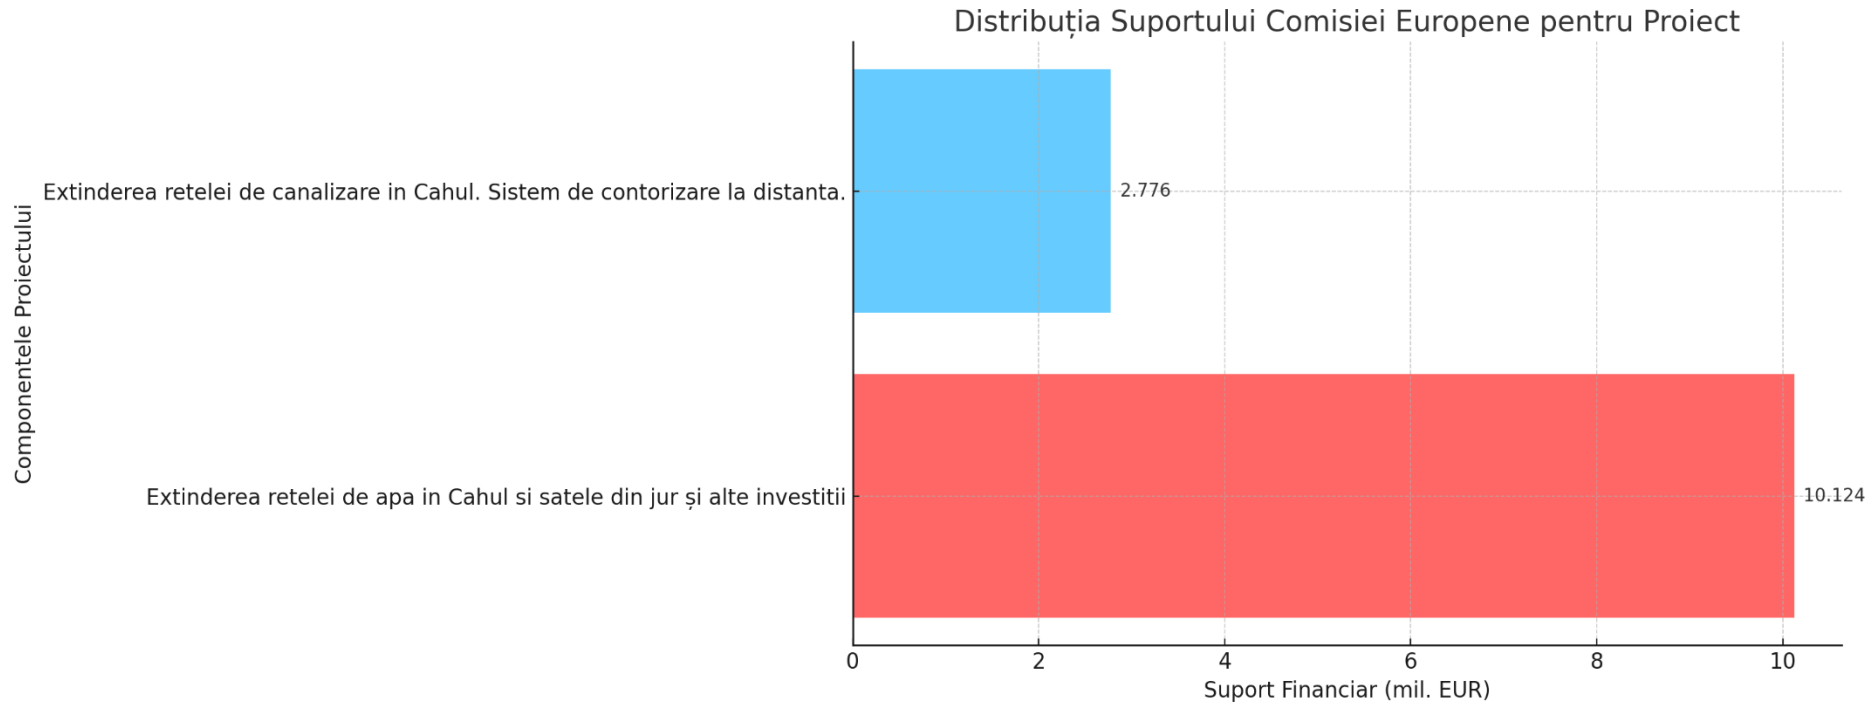



Servicii de Consultanță:

Serviciile de consultanță sunt contractate prin Fichtner W&T GmbH, cu contractul semnat la 3 iunie 2019, pentru întreaga durată a proiectului, inclusiv Actul Adițional nr. 6 din 9 februarie 2024, în valoare de 4.999.970,14 EUR. AA#7 este în curs de negociere.

Servicii Contractate:

Elaborarea Proiectului și Licitarea; Asistență în evaluare și contractare conform standardelor FIDIC; Supraveghere la fața locului pe perioada construcției; Măsuri de sprijin pentru PEA-1, PEA-2 și Apa-Canal Cahul; Comunicare și Vizibilitate.

Programul Proiectului:

Proiectul este planificat pentru 5 ani (2019-2025/2026):

Componentele de finanțare BMZ: T3 2019 – T4 2025 (+12 luni de Perioadă de Notificare a Defecțiunilor);

Componentele de finanțare UE: T1 2021 – T4 2025 (+12 luni de Perioadă de Notificare a Defecțiunilor). Noul termen propus - T4 2026 (+12 luni de PND).



Componenta 1 este separată în două loturi:

LOT 1 – Alimentare cu apă – prevede construcția 8,2 km de magistrală „Priza de apă Prut – Stația de Tratare Cahul” și 6,5 km de rețele de apă în municipiul Cahul. Contract din 27.07.2023 cu ALKE İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, (Turcia). Valoarea contractului - 7.226.514,64 EURO. La moment lucrările de construcție se desfășoară pe partea dreapta a tronsonului de drum Cahul – Punct Trecere Frontieră.

Progres: 960 m cu țevi de 500 mm.

LOT 2 – Sanitație – prevede construcția 39,762 km rețele de canalizare în mun. Cahul și 4 stații de pompare a apelor uzate. Contract din 29.03.2023 cu asocierea JV JV PGC-Casrep (Moldova-România). Valoarea actualizată a contractului - 9.444.006,18 EURO.

Progres: 39,5 km rețea de canalizare (99,5 %), 1346 racordări (95,3%), 3 SPAU montate (60 %).



Componenta 2:

Construcția SEAU – prevede construcția a SEAU Cahul nouă pentru 32.000 de locuitori.

Contract de proiectare și construcție din 27.03.2022 cu Alkatas Metag JV (Turcia).

Valoarea actualizată contractului - 9.113.250,00 EURO.

Progres: valorificare – 4,34 mln EUR (47,6 %) sau 60 % din volumul lucrărilor de construcție.



Componenta 3 (UE):

Extinderea rețelei de apeduct in Cahul si satele din proximitate și alte investiții –
prevede:

- ***mun. Cahul*** - 9,3 km de apeducte (261 racordări), 14,7 km de rețele de canalizare (776 racordări);
- ***s. Cotihana*** – 15,0 km de apeduct (332 racordări), 11,8 km de rețea de canalizare (331 racordări);
- ***s. Crihana Veche*** – 25,4 km de rețea de canalizare (957 racordări).

Progres: proiect tehnic elaborat, procedură de licitație publică de lucrări declanșată.



Componentele de infrastructură ale Delegației UE:

Starea actuală:

Procedura de licitație (pentru detalii, consultați următorul slide).

Principalele probleme:

Întârziere cu procedura de înregistrare a terenului pentru localizarea rezervoarelor de apă potabilă în Cotihana. Decizia Guvernului privind aprobarea separării terenului de stat a fost aprobată pe 13 martie 2024.

Este necesară prelungirea termenului pentru componentele UE.

Deficitul estimat al bugetului este de aproximativ 30-35%, adică 7,1 milioane de euro. O cerere pentru fonduri suplimentare din fondurile BMZ a fost pregătită și trimisă la KfW.



Componentele de infrastructură ale Delegației UE:

Starea actuală a procedurii de licitație:

Anunțul de licitație a fost publicat pe 9 februarie 2024.

Au fost primite 22 cereri pentru documentele de licitație.

Au fost trimise 8 scrisori de clarificare și 2 acorduri către ofertanții potențiali.

Până la data limită (21 mai 2024), au fost depuse 3 oferte.

Următorii pași:

Evaluarea părții tehnice a ofertelor primite, în termen de maximum 1 lună.

Deschiderea și evaluarea părții financiare.

Pe baza ofertelor financiare și a prelungirii termenului Ac.Fin, luarea deciziei privind semnarea contractului pe lucrări.



Provocările întâlnite (Concluzii):

Capacitatea limitată a PEA din 09/2023 până în 05/2024 a împiedicat implementarea și monitorizarea corespunzătoare a activităților proiectului (întârzieri în raportare, deblocare de fonduri etc.).

Se solicită prelungirea termenului pentru Componentele UE până în T3 2026 (dacă Contractul pentru Lucrările de Construcție va fi semnat în septembrie 2024 + 18 luni pentru perioada de construcție).

Deficitul bugetar reprezintă un risc sever de reducere substanțială a componentelor critice de infrastructură finanțate atât de BMZ, cât și de UE (30-50% din amploarea inițială a lucrărilor - Introducerea apei din râul Prut, Reabilitarea Stației de Tratare a Apei, Rețelele de apă uzată din zona PS-6 în Cahul - din fondurile BMZ, Construcția sistemului de colectare a apelor uzate în zona Crihana Veche și Cahul - din fondurile UE). Fonduri suplimentare trebuie să fie aprobate în acest sens.

Numărul cererilor de conectare la noile rețele de canalizare este scăzut. Se solicită o mai bună implicare din partea PEA, Apa Canal. Măsurile planificate de comunicare și informare trebuie puse în aplicare.



Calendarul estimativ pentru componentele finanțate de BMZ:

Activity Schedule Implementation Phase BMZ	2019	2020												2021												2022												2023	2024	2025	2026
Task		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Procurement of Consulting Services for Implementation Phase																																									
Signing of Consultant Contract / Mobilisation Time Consultant																																									
Design Phase																																									
Detailed Design / Tender documents Urban for Civil works and Equipment for WWTP Cahul and WWTP Cioclovani																																									
Tender Phase																																									
Prequalification for civil works - Contract 1 WSS Cahul Urban																																									
Tender for civil works - Contract 1 WSS Cahul Urban																																									
Tender Evaluation / Negotiations / Award of Contract / Mobilisation Contractor(s) for civil works - Contract 1 WSS Cahul Urban																																									
Prequalification for civil works - Contract 2 WWTP Cahul																																									
Tender for civil works - Contract 2 WWTP Cahul																																									
Tender Evaluation / Negotiations / Award of Contract / Mobilisation Contractor(s) for civil works - Contract 2 WWTP Cahul																																									
Construction Phase																																									
Contract 1 WSS Cahul Urban																																									
Contract 2 WWTP Cahul (Design / Construction)																																									
Defects Liability Period / Remedy of Defects																																									
Final Acceptance / Final Report																																									



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Vă mulțumim pentru atenție!

bd. Ștefan cel Mare, 12,
Orașul Cimișlia,
Republica Moldova, MD-4101

Tel. +373 241 2 62 86
Email: adrsud@adrsud.gov.md
Web: www.adrsud.md
