




Maria CULEȘOV
Director



Sergiu GHERCIU,
Secretar de Stat

2019

Raport trimestrial de activitate al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada iulie-septembrie 2019

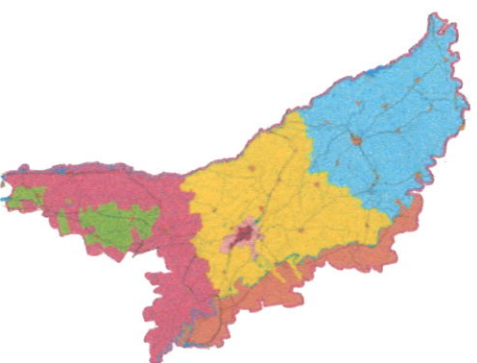

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
I. PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE						
1.1.	Activități de pregătire pentru lansarea procesului de elaborare a SDR Sud 2021-	Analiza documentelor de politici actualizate, din domeniile aferente dezvoltării regionale, în vederea încadrării noilor abordări în Strategia de Dezvoltare Regională. Elaborarea structurii analizei socio-economice. Crearea bazei de date cu indicatori statistici necesari în elaborarea analizei socio-economice a RDS.	Trim III-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: Activitatea respectivă urmează a fi realizată după furnizarea de către GIZ/MSPL a Raportului intermediar de evaluare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020. În acest context, se va lua decizia la nivel național privind încadrarea / neîncadrarea noilor abordări ale dezvoltării regionale, în vederea trasării principalelor direcții de intervenție a noilor Strategii de Dezvoltare Regională. Pentru realizarea activității respective, în perioada vizată a fost studiat Îndrumarul Metodologic: Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională, elaborat de ESRA, precum și Ghidul Orientativ de elaborare a analizei economico-sociale. În proces de realizare: Activitatea respectivă urmează a fi realizată după furnizarea de către GIZ/MSPL a Raportului intermediar de evaluare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020. În acest context, se va lua decizia la nivel național privind încadrarea / neîncadrarea noilor abordări ale dezvoltării regionale, în vederea trasării principalelor direcții de intervenție a noilor Strategii de Dezvoltare Regională. Pentru realizarea activității respective, în perioada vizată a fost studiat Îndrumarul Metodologic: Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Regională, elaborat de ESRA, precum și Ghidul Orientativ de elaborare a analizei economico-sociale.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori de progres	Realizat
1.2.	Revizuirea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS Sud	Analiza gradului de realizare a planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS	Trim III	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada vizată, a fost colectată informația privind activitățile ADR Sud și inițiată elaborarea rapoartelor de analiză pentru Planurile de implementare PRS pentru domeniile AAC și EE. De asemenea au fost elaborate scrisorile de solicitare către instituțiile vizate în planuri pentru a colecta datele privind activitățile realizate.
		Actualizarea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS	Trim III	SPRCE	-	Nerealizat: Activitatea urmează a fi realizată în urma definitivării rapoartelor de analiză a îndeplinirii planurilor privind realizarea PRS AAC, EE, și Strategiei MDS.
1.3.	Conceptualizarea ideii de aprovizionare cu apă a localităților din bazinul râului Nistru (raioanele Căușeni și Ștefan Vodă) din surse de apă de suprafață	Analiza cadrului legal, strategic, precum și studiile în domeniul, pentru examinarea posibilității de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din bazinul râului Nistru	Trim II	SPRCE	Cadru normativ și strategic studiat	Realizat: În perioada iulie-septembrie 2019, a fost studiat cadrul normativ pentru examinarea posibilității de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din bazinul r. Nistru, și anume: - Strategia „Moldova 2020”; - Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014 – 2028; - Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020; - Strategia de dezvoltare Regională Sud 2016-2020; - Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Căușeni 2012-2022; - Programul de dezvoltare social-economică a raionului Ștefan-Vodă pentru perioada anilor 2016-2021; - Legea nr. 272 din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă; - Legea nr. 1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală; - Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; - Programul Regional Sectorial de alimentare cu apă și de canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
	Formarea grupului de lucru care va participa în procesul de conceptualizare a ideii	Trim III	SPRCE	-	În proces de realizare: În perioada trimestrului III 2019, în vederea creării grupului de lucru care va participa la procesul conceptualizării ideii de aprovizionare cu apă a raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă, au fost realizate următoarele: - a fost elaborată o scrisoare de confirmare de către consiliile raionale a susținerii ideii de conceptualizare a aprovizionării cu apă, precum și scrisoare de delegare a membrilor grupului de lucru; - a fost elaborată o listă cu potențiali membri ai grupului de lucru, în vederea expedierii solicitărilor precum și o scrisoare de solicitare a suportului acestora; - a fost elaborat un model de ordin de înființare a grupului de lucru; - a fost examinat un model de termeni de referință pentru angajarea unui expert care va participa la elaborarea studiilor de fezabilitate. Activitatea urmează a fi transferată pentru trimestrul IV, dat fiind faptul că inițiativele urmează a fi confirmate de către președinții raioanelor Căușeni și Ștefan Vodă, fapt ce urmează după instituirea acestora în funcție după alegerile locale din 2019. Realizat: În perioada 16-21.09.2019, în cadrul proiectului „Dezvoltarea regională în Republica Moldova: suport privind implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS)”, a fost desfășurată o vizită de studiu în Cehia, cu participarea a 21 reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Biroului Național de Statistică și Agenției
1.4.	Participare în implementarea proiectului „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS”	Trim I-IV	SPRCE	1 sesiune de instruire desfășurată 3 participanți	

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
	Colectarea și verificarea datelor pilot care vor fi utilizate în sistemul GIS.	Trim III	SPRCE	-	de Guvernare Electronică, dintre care 3 angajați din cadrul ADR Sud. Scopul vizitei de studiu a reprezentat schimburi de experiență, transferul de bune practici din Cehia în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea planificării strategice, a dezvoltării urbane și proiectelor investiționale prin utilizarea datelor geospațiale, încurajarea colaborării în domeniul cartografiilor, colectării de date și oferirii unor servicii inovative, digitalizate populației. Vizita de studiu a fost organizată de Agenția cehă GEOTest în colaborare cu Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare Inter-națională a Republicii Cehie. Nerealizat: Conform planului de implementare a proiectului, colectarea datelor va fi efectuată după participarea specialiștilor din cadrul instituției la vizite de studiu și următoarea sesiune de instruire planificată în trimestrul IV. Dat fiind faptul că activitățile din cadrul proiectului derulează cu întârziere, această activitate a fost transferată pentru trimestrul IV.
1.6.	Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale	Trim I, III	SPRCE	1 bază de date cu indicatori actualizată	Realizat: În perioada vizată a fost actualizat sistemul de indicatori de M&E dat fiind faptul că a fost prezentat în data de 10 iulie 2019, raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru semestrul I 2019.
	Elaborarea rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Sud și prezentarea către MADRM și CRD Sud	Trim I, III	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat MADRM	Realizat parțial: În trimestrul III a fost prezentat spre aprobare către MADRM Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru semestrul I 2019. Acesta nu a fost prezentat către CRD Sud dat fiind faptul că nu a fost convocată nici o ședință în perioada de raportare.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
		Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM	Trim I-IV	SPRCE	1 raport elaborat și prezentat MADRM	Realizat: În perioada vizată a fost elaborat și prezentat în termen către MADRM raportul trimestrial de activitate a ADR Sud pentru perioada aprilie-iunie 2019.
		Evaluarea impactului proiectelor implementate de ADR Sud în perioada 2012-2015 și prezentarea rapoartelor CRD Sud	Trim III-IV	SMP	-	Nerealizat: Activitatea urma să fie inițiată către finele trimestrului III, conform planului MADRM privind evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională, dar a fost transferată pentru trimestrul IV.
		II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR				
2.1.	Implementarea proiectului "Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni"	Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim I	SMP	-	Nerealizat: Raportul final va fi elaborat după aprobarea de către MADRM a Actului de predare - primire a costurilor investiționale
		Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție (etapa II, Stația de epurare)	Trim I-II	SFA	-	Nerealizat: În perioada vizată activitățile planificate nu au fost realizate, motivul fiind anularea procedurii de licitație publică de către ANSC, deoarece documentația de atribuire nu a fost una clară și explicită. La moment, documentația de proiect a fost transmisă către compania de proiectare în vederea corectării neconcordanțelor admise.
		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (etapa II, Stația de epurare)	Trim III-IV	SMP	1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Nerealizat: În perioada vizată activitățile planificate nu au fost realizate, din motiv că Contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor de construcție nu a fost semnat. De asemenea, în perioada vizată a fost elaborat și transmis către MADRM un raport pe proiectul menționat.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
2.2.	Implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sirma – Tomai – Sărăteni - Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R3"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV	SMP	3 vizite de monitorizare efectuate 2 ședințe desfășurate 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare au fost finalizate lucrările de construcție contractate. La data de 17.09.2019 antreprenorul a informat despre finalizarea lucrărilor, astfel comisia de recepție a fost creată, urmează facturarea integrală a lucrărilor executate și numai ulterior organizarea recepției la terminarea lucrărilor. 3 vizite de monitorizare și 2 ședințe au fost desfășurate în perioada de raportare. A fost elaborat și transmis către MADRM 1 raport de monitorizare pe proiect.
2.3.	Implementarea proiectului "Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională"	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim I-IV	SMP	2 vizite de monitorizare efectuate 1 ședință desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Realizat: În perioada de raportare au fost executate lucrări de sistemă-tizare pe verticală în volum de 2619 m3. Ținem să menționăm că pe parcursul perioadei vizate a fost solicitată de la beneficiar identificarea carierei, pentru a putea fi executate lucrările de terasament. Au fost desfășurate 2 vizite de monitorizare și o ședință. A fost elaborat și transmis către MADRM 1 raport de monitorizare pe proiectul menționat.
2.4.	Implementarea proiectului "Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Căntimir" (bloc chirurgical)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului	Trim II	SMP	-	Nerealizat: Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului va fi desfășurat după ce vor fi facturate lucrările de construcție contractate, astfel, activitatea se transferă pentru perioada trimestrului IV.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
2.5.	Implementarea proiectului "Oportunități pentru atrac-tivitatea investițională în economia Regiunii de Dez-voltare Sud" (ZEL Căușeni).	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție fi-nală în cadrul proiectului	Trim III	SMP	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată deoarece nu a fost organizată recepția la terminarea lucrări-lor.
		Transmiterea costurilor in-vestiționale formate către aplicant	Trim III	SMP	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată deoarece nu a fost organizată recepția finală.
		Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MA-DRM	Trim III	SMP	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu s-a realizat activitatea vizată deoarece nu a fost transmise costurile investiționale formate.
		Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții pu-blice pentru lucrări de con-strucție	Trim I-II	SFA	-	Nerealizat: Activitatea nu a fost realizată deoarece la moment este în proces de modificare proiectul tehnic de execuție, responsa-bil de modificare fiind Rezidentul ZEL, fără care, evident, nu este posibil a întreprinde careva măsuri pentru implementa-rea lucrărilor finanțate din FNDR, și respectiv, inițierea proce-durilor de achiziții publice.
		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim II-III	SMP	1 raport de monitorizare pe proiect elaborat și transmis MADRM	Nerealizat: Sarcinile de implementare a proiectului dat sunt repartizate între 3 actori de implementare după cum urmează: - Consiliul raional Căușeni (buget raional) – construcția rețelelor edilitare (rețele de gaz natural, apeduct și canalizare, re-țele electrice); - Rezidentul ZEL, S.R.L. Coroplast Harness Technology (inves-tiție proprie) – proiectarea și construcția hălei industriale; - ADR Sud (FNDR) – construcția drumului de acces și amena-jarea teritoriului. La moment este în proces de modificare proiectul tehnic de execuție, responsabil de modificare fiind Rezidentul ZEL, fără

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim III	SMP	-	care, evident, nu este posibil a întreprinde careva măsuri pentru implementarea lucrărilor finanțate din FNDR. În perioada de raportare a fost elaborat și transmis către MA-DRM 1 raport de monitorizare a proiectului. Nerealizat: Activitatea planificată nu a fost posibil de realizat, din următoarele considerente: - Proiectul halei industriale nu a fost modificat; - Nu a fost posibil de desfășurat procedura de achiziție publică; - Nu a fost semnat contractul privind execuția lucrărilor finanțate din FNDR.
2.7.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 1 "Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu, etapa II, Conectarea caselor individuale de locuit la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu."	Trim III	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 14.08.2019 în parteneriat cu GIZ/MSP Moldova, beneficiarul, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic, a fost organizat evenimentul de recepție finală a lucrărilor în cadrul proiectului. Prin urmare, antreprenorul înlătură obiecțiile consemnate în anexele procesului de recepție după care urmează recepția finală, elaborarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate și întocmirea raportului final al proiectului. Nerealizat: În perioada vizată nu a fost elaborat actul de predare primire a costurilor investiționale, din motiv că antreprenorul nu a înlăturat obiecțiile consemnate în anexele procesului verbal, astfel activitatea se transferă pentru perioada trimestrului IV. Nerealizat: În perioada vizată nu a fost elaborat raportul final, din motiv că nu au fost transmise costurile investiționale formate, astfel activitatea se transferă pentru perioada trimestrului IV
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim III	SMP	-	
	Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MA-DRM	Trim III	SMP	-	

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
2.8.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 1)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim III	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: Activitatea respectivă a fost realizată înainte de termenul stabilit, fiind raportată în perioada trimestrului II. Astfel, la data de 31.05.2019, a fost organizat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ/MSPL Moldova, beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. Prin urmare, antreprenorul înlătură obiecțiile consemnate în anexele procesului de recepție după care urmează recepția finală, elaborarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate și întocmirea raportului final al proiectului.
2.9.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare" (ETAPA I, FAZA 2)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim III	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: La data de 21.08.2019, a fost organizat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai ADR Sud, GIZ/MSPL Moldova, beneficiarului, antreprenorul, proiectantul și responsabilul tehnic. Prin urmare, antreprenorul înlătură obiecțiile consemnate în anexele procesului de recepție după care urmează recepția finală, elaborarea Actului de predare primire a costurilor investiționale formate și întocmirea raportului final al proiectului.
2.10.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 3 "Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza" și rețelele interioare" (ETAPA II)	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim III	SFA	-	Nerealizat: Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul III, dat fiind faptul că este în proces de elaborare documentația de proiect.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat	
2.12.	Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 2 " Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cup-cui din raionul Leova "	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim III	SFA	-	Nerealizat: Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul III, dat fiind faptul că este în proces de elaborare documentația de proiect.
2.13.	Implementarea proiectului MSPL Leova: Măsura investițională 3 " Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova; Construcția stației de pompare a apelor uzate în orașul Leova "	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim III	SFA	-	Nerealizat: Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice nu a fost posibilă în trimestrul III, dat fiind faptul că este în proces de elaborare documentația de proiect.
2.14.	Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din or. Basarabeasca"	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim III	SFA	-	Nerealizat: În prezent este în proces de elaborare documentația de atribuire pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Acțiunile menționate sunt efectuate de către specialiștii ADR Sud în colaborare cu experții GIZ/MSPL naționali și internaționali.
2.15.	Implementarea proiectului investițional "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din or. Leova"	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim III	SFA	-	Nerealizat: În prezent este în proces de elaborare documentația de atribuire pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări. Acțiunile menționate sunt efectuate de către specialiștii ADR Sud în colaborare cu experții GIZ/MSPL naționali și internaționali, fiind inițiate în perioada de raportare. Activitatea respectivă, este transferată pentru trimestrul IV.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
3.2.	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă	Trim I-IV	SPRCE	38 sesiuni desfășurate 11 participanți	Realizat: Pe parcursul trimestrului III, 11 specialiști ADR Sud au beneficiat de instruire în următoarele domenii: - implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei în domeniul politici urbane și de dezvoltare urbană; - implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS); - modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; - dezvoltarea capacităților privind planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice.
		Participare în cadrul forumului deschis privind guvernarea locală și dezvoltarea regională organizat de AAP	Trim III	SPRCE AAP	-	Nerealizat: În perioada vizată de către Academia de Administrare Publică nu au fost organizate și desfășurate forumurile preconizate.
3.3.	Dezvoltarea capacităților membrilor CRS AAC și MDS	Facilitarea participării membrilor CRS Sud și a grupurilor de lucru în activități de instruire	Trim III	SPRCE	1 sesiune desfășurată 1 participant	Realizat: În data de 17 septembrie 2019, un membru CRS Sud a participat la Conferința Națională pentru sectorul de alimentare cu apă și canalizare, organizată de Asociația „Moldova Apă-Canal” cu suportul Proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”. Conferința cu tematica „Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate” a servit drept o platformă de discuții a polițicilor și identificarea soluțiilor la problemele existente în sector. În cadrul acesteia au fost împărtășite cele mai bune practici de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. În calitate de participanți, 128 la număr, au fost invitați întreprinderile din sectorul de AAC, APL-uri, MADRM, partenerii externi de dezvoltare, experți naționali și internaționali, 20 fiind din RDS.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
3.4.	Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, operatori de servicii, etc.)	Organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare pentru APL din RDS în vederea familiarizării acestora cu politicile statului în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv cu documentele de planificare strategică și programare la nivelul RDS.	Trim I-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: Pe parcursul trimestrului III de activitate, în vederea organizării evenimentelor de informare a APL, au fost efectuate următoarele: - Elaborat proiectul agendei evenimentelor de informare; - Elaborate prezentările PPT pe diverse tematici incluse în agendă; - Elaborate scrisorile de solicitare a suportului logistic către consiliilor raionale în organizarea evenimentelor; - Elaborat modelul de invitație pentru APL-urile din regiune. Desfășurarea propriu-zisă a evenimentelor va fi efectuată în trimestrul IV, după instituirea în funcție a primarilor și președinților de raioane precum și definitivarea agendelor conform actualității subiectelor.
3.5.	Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS	Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu	Trim III	SPRCE	2 vizite de studiu 32 beneficiari	Realizat: În perioada de raportare au fost desfășurate 2 vizite de studii în vederea preluării bunelor practici, și anume: 1. 30.06-10.07.2019, echipa formată din 11 reprezentanți ai MADRM, ADR Sud, Centru, Nord și UTA, Solidarity Fund în Moldova, APL I (Drochia, Ceadâr-Lunga, Soroca, Ialoveni, Strășeni), au efectuat un stațiu privind Revitalizarea Urbană în Polonia. Scopul stagiului a fost familiarizarea participanților cu metodologia de elaborare a Programelor de revitalizare urbană, procesul de implementare și monitorizare a proiectelor de revitalizare, parteneriatul public-privat în procesul de revitalizare. Totodată, vizita a avut scopul împărtășirii de bune practici de către reprezentanții autorităților publice locale din Polonia privind realizările în domeniul revitalizării urbane.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
3.6.	Raportarea instruirilor	Raportarea asupra implementării planului anual de instruire	Trim I,III	SPRCE	1 raport elaborat	Realizat: În perioada de raportare a fost elaborat și prezentat în termen Raportul asupra implementării planului anual de instruire pentru semestrul I 2019, drept anexa nr. 3 la Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru aceeași perioadă.
IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR						
4.1.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	Conlucrarea cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ) în vederea extinderii în RDS a activităților în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”.	Trim II-III	SPRCE	2 ședințe comune realizate	În proces de realizare: În data de 17.08.2019 și 21.08.2019 au fost desfășurate 2 ședințe comune cu reprezentanții GIZ ai proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice” în vederea întreprinderii unor activități comune și extinderii agendei Forumului Investițional Regional. Din motiv că nu este recep-

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
	Facilitarea implementării în RDS a proiectului "Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei 2016-2020 în domeniul politici urbane și de dezvoltare urbană" co-finanțat din fondurile programului de cooperare poloneză.	Trim I-IV	SPRCE	-	ționat răspunsul DUE privind extinderea termenului de implementare a proiectului și desfășurarea forumului, urmează negocierile pentru transferarea activităților. Procedura de semnare a memorandumului va fi inițiată după agrearea condițiilor și termenilor cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și după lansarea portalului investițional al RDS, dat fiind faptul că promovarea investițiilor este prioritatea de bază pentru cooperare. În proces de realizare: În perioada vizată, în vederea realizării activității, a fost acordată asistență privind elaborarea programelor de revitalizare urbană pentru or. Ștefan-Vodă și mun. Cahul prin explicarea Linii Directoare privind Revitalizarea Urbană, modalității de colectare a indicatorilor și identificarea zonelor degradate în cadrul sesiunilor organizate: - 17.07.2019 - sesiunea Comitetului de Coordonare a procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a orașului Ștefan Vodă, unde au fost prezente 10 persoane; - 19.07.2019 - sesiunea Comitetului de Coordonare a procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a municipiului Cahul (9 persoane); - 21.08.2019 - sesiunea privind acordarea asistenței în elaborarea PRU a orașului Ștefan – Vodă, la care a participat și facilitatorul din or. Căușeni. A fost asigurată comunicarea și furnizată consultanță pentru reprezentanții delegați din cadrul primăriilor menționate în procesul de elaborare a PRU. De asemenea, specialiștii din cadrul ADR Sud a participat la următoarele sesiuni: - 25.07.2019 - sesiunea comună privind revitalizarea urbană, în cadrul căreia au fost prezente 20 de persoane.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
					- 10.09.2019 - ședința de lucru în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”, cu participarea a 20 persoane; - 11.09.2019 - ședința de informare în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională a Moldovei în domeniul politicii urbane și de dezvoltare urbană”. În perioada 30.06 - 10.07.2019, un specialist din cadrul secției Politici Regionale și Cooperare Externă a participat la stagiul privind Revitalizarea Urbană în Polonia, scopul căruia a fost familiarizarea participanților cu metodologia de elaborare a Programelor de revitalizare urbană, procesul de implementare și monitorizare a proiectelor de revitalizare, parteneriatul public-privat în procesul de revitalizare, împărtășirea de bune practici de către reprezentanții autorităților publice locale din Polonia privind realizările în domeniul revitalizării urbane.
	Participarea în procesul de implementare în RDS a Programului „Comunitatea mea” lansat de USAID.	Trim I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada vizată, nu a fost solicitat suportul ADR Sud în activitățile desfășurate în cadrul programului „Comunitatea Mea”.
	Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei „Primarii pentru creștere economică” finanțat de UE	Trim I-IV	SPRCE	1 instruire frecventată	Realizat parțial: La data de 15 iulie 2019, doi specialiști din cadrul secției Politici Regionale și Cooperare Externă au participat la o masă rotundă împreună cu reprezentanții inițiativei „Primarii pentru creșterea economică în RM” în cadrul căreia au fost puse în discuție posibilitățile de cooperare în domeniul promovării dezvoltării economice la nivel local și regional. Ulterior, un

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
4.2.	Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	Facilitarea inițierii și consolidării parteneriatelor și preluarea de bune practici între entitățile din RDS și partenerii externi	Trim IV	SPRCE	8 APL /ONG/ 1 antreprenor /etc. asistați	specialist a absolvit cursul de instruire online pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală obținând certificare, în data de 24.07.2019.
		Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare	Trim I-IV	SPRCE	9 apeluri mediatizate	Realizat: În perioada iulie-septembrie 2019, au fost plasate pe pagina web și pe rețele de socializare informația despre lansare a 9 apeluri de propuneri de proiecte. De asemenea, în vederea informării APL-urilor, a fost actualizat Calendarul apelurilor de Propuneri de proiecte cu informația despre 8 posibilități de finanțare prin intermediul granturilor.
		Promovarea cooperării inter-comunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale	Trim II-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada de raportare nu au fost realizate activități de promovare a cooperării intercomunitare. Această activitate urmează a fi realizată în cadrul desfășurării ședințelor de informare privind dezvoltarea regională, fiind inclus drept subiect în agendă. Promovarea cooperării intercomunitare urmează a fi efectuată mai intensiv în contextul instituirii în funcție a noilor primari și odată cu inițierea instruirilor pentru lansarea Apelului de Propuneri de proiecte din Fondul Național pentru

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
		Asistarea APL din RDS în vederea conceptualizării ideilor de proiecte pentru aplicare la fonduri naționale și apeluri de proiecte cu finanțare externă	Trim I-IV	SPRCE	-	Dezvoltare Regională, fond destinat finanțării proiectelor regionale, care sunt preconizate pentru anul 2020. Nerealizat: În perioada de raportare, nu au fost solicitări de asistență din partea APL din RDS privind elaborarea Notelor Conceptuale.
4.3.	Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții	Asigurarea funcționalității portalului de promovare a investițiilor în RDS elaborat în cadrul proiectului "Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor" finanțat de UE.	Trim II-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: În vederea elaborării portalului de promovare a investițiilor, în perioada de raportare au fost desfășurate următoarele activități: - a fost desemnată compania câștigătoare și semnat contractul privind prestarea serviciilor; - a fost elaborat design-ul preliminar al portalului investițional; - au fost desfășurate ședințe de consultare precum și asigurată comunicarea cu antreprenorul privind proiectul site-ului; - a fost colectată, formatată informația din profilurile investiționale și încărcată în sistem; - au fost solicitate, identificate, alese și transmise către pres-tatorul de servicii imagini de calitate pentru fiecare interfață a site-ului și încărcate în sistem. În aceeași perioadă, către Delegația Uniunii Europene a fost înaintată solicitarea de extindere a termenului de implementare a proiectului, astfel, site-ul va fi activ după aprobarea solicitării. Activitatea de asigurare a funcționalității portalului va fi re-alizată după finalizarea proiectului.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
		Participarea ADR Sud în activități de promovare a regiunii ca destinație pentru investitori, cu prezentarea materialelor promoționale interesante pentru potențialii investitori	Trim II-IV	SPRCE	-	În proces de realizare: Perioada de implementare a proiectului „Poarta de Sud a Moldovei, deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor” urmează a fi extinsă în cazul acceptului de către DUE, astfel participarea ADR Sud în activități de promovare a regiunii ca destinație pentru investitori, cu prezentarea materialelor promoționale în această perioadă nu a fost posibilă. În vederea realizării activității, neavând produsele proiectului, agenția a creat pagina pe rețelele de socializare: „Investește în Regiunea de Dezvoltare Sud”
V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ						
5.1.	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	Actualizarea paginii Web a ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	76 articole publicate 88098 vizualizări	Realizat: În perioada de raportare, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 76 de comunicate care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020 și în curs de implementare. Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 88098 de vizualizări.
		Întreținerea contului facebook al ADR Sud	Trim I-IV	SPRCE	157 de postări Impact persoane - 52684 de vizualizări	Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 157 de postări ale comunicatelor, avizelor și altă informație relevantă pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 52684 de vizualizări.

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
	Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS	Trim I-IV	SPRCE	33 de evenimente mediatizate 1 buletin informativ editat și afișat 10 anunțuri afișate 8 panouri informative actualizate 76 comunicate elaborate 10 reportaje TV 21 reportaje radio 52 de articole în presa scrisă	Realizat: Pe parcursul Trim III, prin intermediul paginii web și paginii de Facebook ale instituției, precum și a rețelelor de socializare au fost mediatizate pe larg 33 de evenimente care au ținut nemijlocit de promovarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională implementate în RDS și a evenimentelor de anvergură regională și națională. Printre evenimentele de mediatizare/promovare se numără evenimentele socio-culturale de anvergură desfășurate în perioada dată în RDS (Ziua Dunării, Festivalul Național al Strugurelui), conferințele internaționale și naționale de lansare și finalizare a proiectelor, campanii de informare, dezbateri și consultări publice, ședințe ale grupurilor de lucru pentru achiziții desfășurate în cadrul proiectelor aflate în curs de implementare, evenimente de semnare a acordurilor de cooperare cu partenerii externi, ședințe organizate de ADR Sud în vederea coordonării mersului lucrărilor, vizite de monitorizare efectuate în cadrul proiectelor de dezvoltare regională, întrevederi cu partenerii de dezvoltare în vederea cooperării, lansare/ recepții finale proiecte, vizite de studiu etc. În scopul informării publicului larg, a mediatizării activității ADR Sud și asigurării vizibilității acesteia, în perioada de raportare au fost afișate pe panourile informative ale instituției din incinta ADR Sud și din cadrul Consiliilor raionale 1 buletin informativ (ediția nr.3, 2019), anunțuri privind apelurile de propuneri de proiecte și programe de finanțare lansate, anunțuri de angajare, fotografii și alte informații relevante despre proiectele aflate în curs de implementare etc.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune. Participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS (Parada Florilor; Festivalul Piersicului; Ziua Dunării; etc.	Trim II-IV	SPRCE	-	Pentru asigurarea maximală a transparenței și vizibilității activității ADR Sud, în perioada de referință au fost elaborate în total 76 de comunicate, anunțuri, invitații pentru societatea civilă și mass-media și note informative care vizează nemijlocit activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, în curs de implementare, care au fost plasate pe pagina web a ADR Sud și ulterior preluate și difuzate cu o frecvență mai mare de site-urile și sursele media. Materialele elaborate de către ADR Sud au fost preluate de sursele media din țară și din regiune și s-au regăsit în 10 reportaje TV, 21 reportaje radio, 52 articole în presa scrisă și electronică locală și națională.
						Nerealizat: În perioada de raportare nu au fost identificate evenimente pentru participarea ADR Sud în calitate de partener.
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	Organizarea sesiunii de informare "INFO DAY" în RDS pentru promovarea dezvoltării regionale	Trim II-IV	SPRCE	-	Nerealizat: Activitate preconizată pentru trimestrul IV, o dată cu desfășurarea evenimentului „ADR Sud - 10 ani de Dezvoltare Regională”.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilitate	Indicatori de progres	Realizat
		Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud "Dezvoltarea regională"	Trim I-IV	SPRCE	1 buletin elaborat și distribuit la circa 600 de beneficiari	Realizat: În perioada de referință a fost elaborat 1 buletin electronic informativ "Dezvoltare regională" (Nr. 3, Anul 2019), acesta fiind distribuit unui număr de circa 600 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a fost plasat pe site-ul ADR Sud și distribuit pe rețelele de socializare.
ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ						
6.1.	Facilitarea procesului de desfășurare a concursului de selectare a noilor membri ai CRD Sud	Colectarea candidaturilor pentru membrii CRD Sud reprezentanți ai autorităților publice	Trim III	SPRCE	-	Nerealizat: Activitate transferată pentru trimestrul IV, dat fiind faptul că urmează să se stabilească noua componență CRD, precum și acest fapt este posibil doar după desfășurarea alegerilor locale și instituirea primarilor și președinților de raioane în funcții.
		Colectarea dosarelor de participare la concurs pentru reprezentanții ONG și a sectorului privat	Trim III	SPRCE	-	Nerealizat: Activitate transferată pentru trimestrul IV, dat fiind faptul că urmează să se stabilească noua componență CRD.
6.2.	Asigurarea secretariatului CRD Sud	Organizarea și desfășurarea sesiunilor ordinare ale CRD Sud	Trim I-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada iulie-septembrie 2019, nu au fost desfășurate sesiunile CRD dat fiind faptul că nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi.
6.3.	Asigurarea secretariatului CRS Sud	Organizarea și desfășurarea sesiunilor ordinare ale CRS în domeniul AAC	Trim III-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada iulie-septembrie 2019, nu au fost desfășurate sesiunile CRS AAC dat fiind faptul că activitatea este desfășurată cu suportul GIZ/MSP, precum și nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi.

Acțiuni		Sub-acțiuni	Termen de realizare	Responsabilități	Indicatori de progres	Realizat
		Organizarea și desfășurarea sesiunilor ordinare a CRS în domeniul MDS	Trim III-IV	SPRCE	-	Nerealizat: În perioada iulie-septembrie 2019, nu au fost desfășurate sesiuni CRS MDS dat fiind faptul că activitatea este desfășurată cu suportul GIZ/MSPL, precum și nu au fost identificate subiecte pentru ordinea de zi.

ELABORAT:

Oxana Cazacu, șef secție politici regionale și cooperare externă

Andrei Popușoi, șef secție management proiecte

Șef secție finanțe și achiziții

COORDONAT:

Igor MALAI, Șef direcție politici de dezvoltare regională

Vlad UNGUREAN, Șef secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională

