




MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

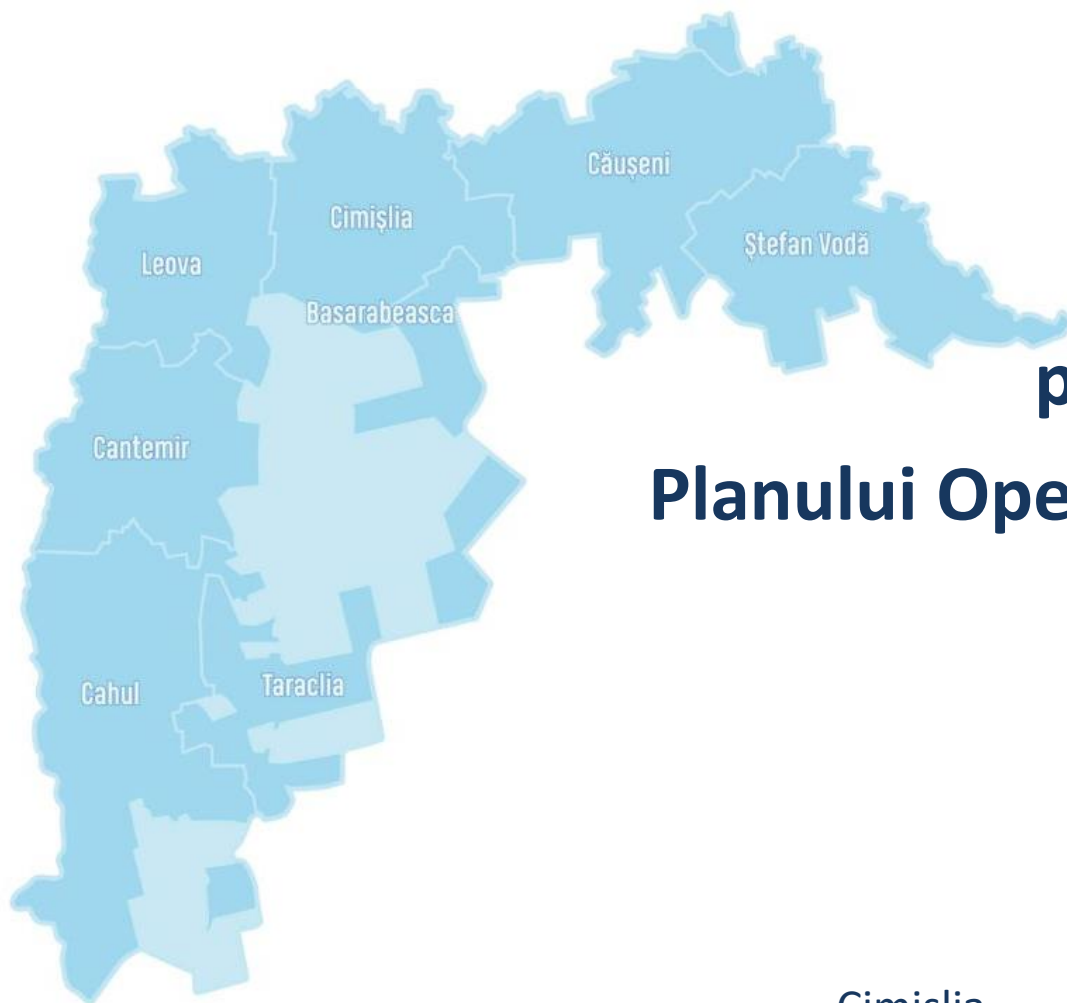

RAPORT DE PROGRES privind implementarea Planului Operațional Regional Sud 2022-2024

**Perioada de raportare
ianuarie – iunie 2024**

Cimișlia,
26.07.2024



POR - principalul document de programare la nivel regional și ce asigură corespondența dintre Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2022-2028 și intervențiile programate la nivel de regiune

**Programul Operațional Regional
Sud 2022-2024**


Obiectivul general - sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor

Scopul POR Sud - asigurarea unui cadru eficient de planificare pentru a determina direcțiile și ritmul de dezvoltare, a eficientiza activitatea autorităților în gestionarea problemelor regionale, de a promova regiunea și de a atrage fonduri externe




Măsurile de intervenție și număr de proiecte aprobate în Documentul unic de program anii 2022 – 2024

Regiunea de Dezvoltare Sud

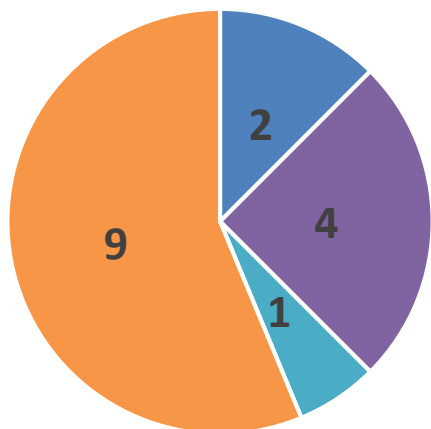

- Domeniul 1.1 Valorificarea infrastructurilor de afacere (VIA)
- Domeniul 1.2 Dezvoltarea mediului antreprenorial (DMA)
- Domeniul 1.3 Sporirea atractivității turistice (AT)
- Domeniul 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice (RUDISP)
- Domeniul 2.4 Modernizare infrastructurii tehnico edilitare și a rețelelor de utilități publice (MITERUP)
- Domeniul 3.1 Aprovizionarea cu apă și sanitație (AAS)

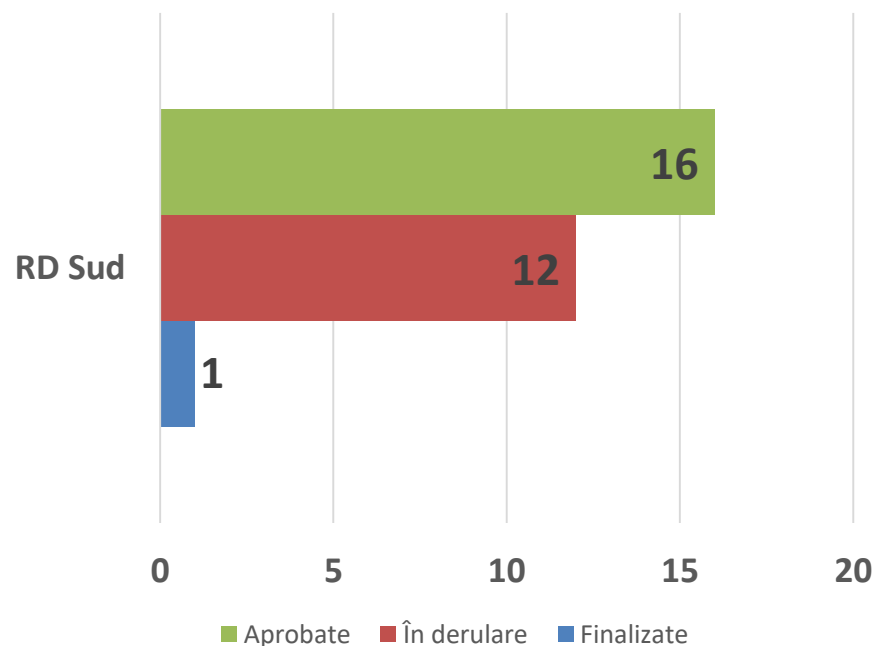



Proiecte aprobate în Documentul unic de program anii 2022 – 2024

Domeniul de intervenție	Statut	Indicatori de produs:	
		Planificați	Realizat, inclusiv semestrul I A-2024
1.1 Valorificarea infrastructurilor de afaceri	- 1 proiect finalizat, - 1 proiect în derulare.	- 2,4 km rețele electrice de tensiune înaltă; - 1,41 km rețea de apeduct; - 1,58 km rețea de canalizare; - 0,87 km rețea de gaze naturale cu presiune medie; - 0,39 ha amenajarea terenului adiacent; - construcția halei de producere cu suprafață de 1191 m2.	- 2,4 km rețele electrice de tensiune înaltă; - 1,41 km rețea de apeduct; - 1,58 km rețea de canalizare; - 0,87 km rețea de gaze naturale cu presiune medie; - 20,5 % amenajarea teritoriului; - 44,5% din construcția halei de producere cu suprafață de 1191 m2.
2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice	- 1 proiect în proces de achiziție (<i>evaluarea ofertelor</i>); - 3 proiecte în derulare;	- 9 terenuri de joacă amenajate; - 3 instituții reabilitate; - 1 stadion multifuncțional amenajat; - 610 m albie râului curățită și pavată; - fântână și clopotniță germană reconstruită; - 1 parcare pentru automobile; - 1 pistă pentru bicicliști delimitată; - 995,2 m2 de acoperiș renovat; - 4520 m2 de spații verzi renovat;	- 4,7 % din pavajul pietonal; - 53 % din clopotniță germană reconstruită.




Proiecte aprobate în Documentul unic de program anii 2022 – 2024

Domeniul de intervenție	Statut	Indicatori de produs:	
		Planificați	Realizat, inclusiv semestrul I A-2024
2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice	- 1 proiect în proces de achiziție (<i>evaluarea ofertelor</i>);	- 87,6 km de rețele de cablu iluminare stradală modernizată; - 765 de piloni montați; - 2397 de corpuri de iluminat LED instalate.	- 2,4 km rețele electrice de tensiune înaltă; - 1,41 km rețea de apeduct; - 1,58 km rețea de canalizare; - 0,87 km rețea de gaze naturale cu presiune medie; - 20,5 % amenajarea teritoriului; - 44,5% din construcția halei de producere cu suprafață de 1191 m2.
3.1 Aprovizionarea cu apă și sanitație	- 5 proiecte în derulare - 1 proiect în proces de achiziție (<i>evaluarea ofertelor</i>) - 3 proiecte neinițiate;	- 157,96 km de rețele de apeduct; - 49,76 km de rețele de canalizare; - 13 stații de pompare; - 16 stații de tratare a apei; - 3 castele de apă; - 1 turn de apă; - 8 rezervoare de apă potabilă.	- 87,61 km rețele de apeduct; - 53,60 km rețea de canalizare; - 82,6 % din 13 stații de pompare; - 2 castele de apă construite; - 46,7 % din blocul de tratare biologică de 2500 m3/24h.



Valoarea financiară alocată/valorificată din sursele FNDRL a proiectelor incluse în DUP 2022 – 2024 în RD Sud Perioada 2022 – 2024, semestrul I

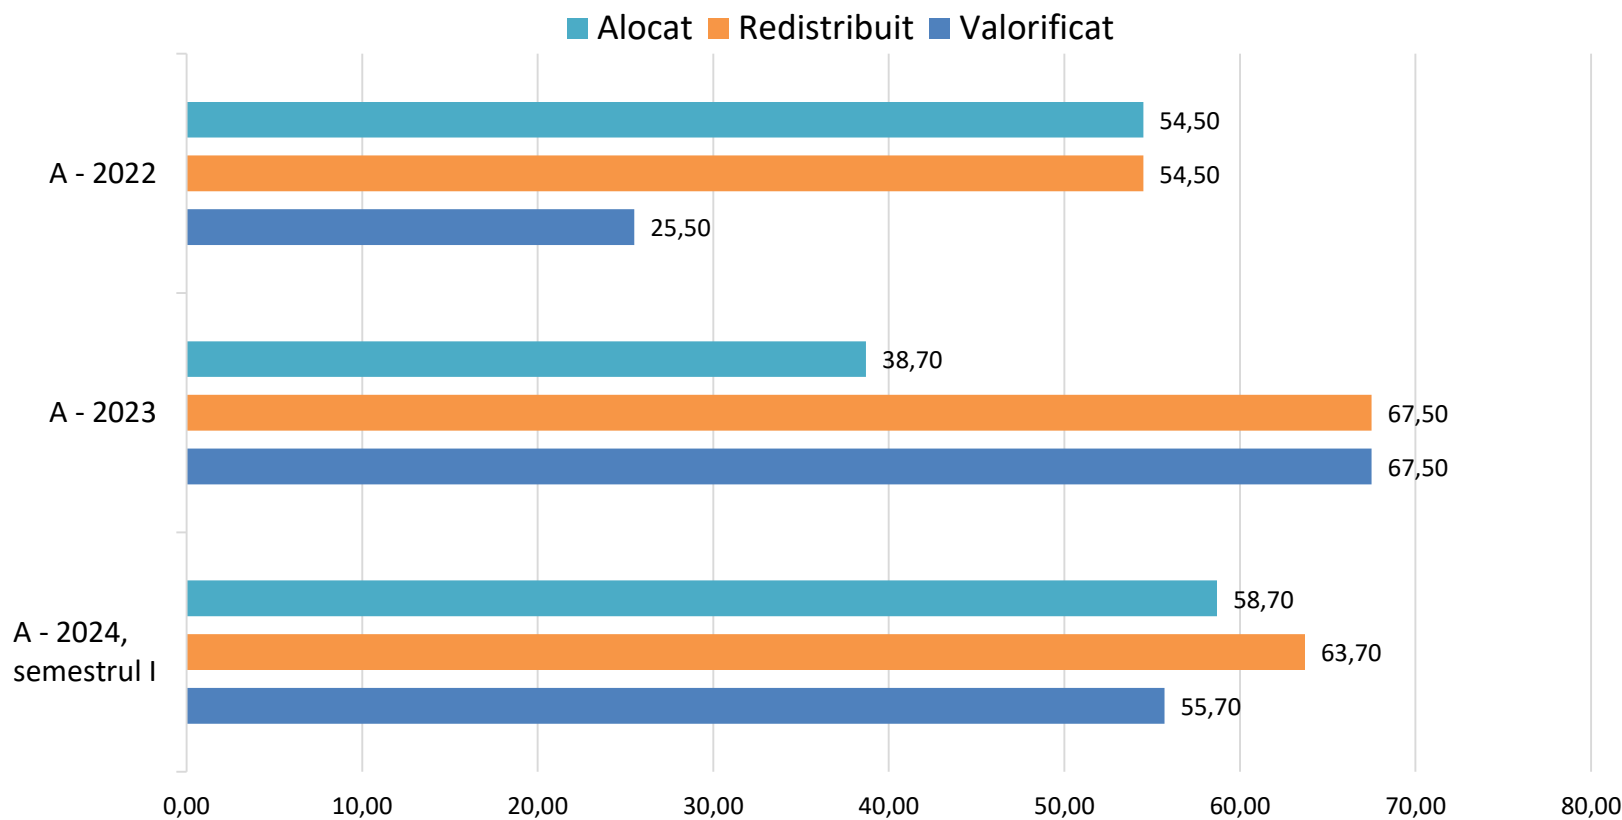



Principali indicatori obținuți în realizare politicii de dezvoltare regională pentru perioada ianuarie-iunie 2024

4 proiecte inițiate lucrări de construcție;

9 decizii GLAP de atribuire pentru lucrări și servicii ;

13 proceduri de achiziții publice organizate (7 finalizate cu încheierea contracte, 3 anulate, 1 proces de evaluare, 1 reevaluare, 1 în proces de contestații);

10 contracte de antrepriză și de servicii de supraveghere tehnică semnate

35 oferte în proces de evaluare depuse pentru executarea lucrărilor și servicii

3,762 km de rețea de canalizare montată

21,28 km de rețea de apeduct magistral montată

5,63 km de rețea interioară de apeduct montată

140 de bransamente la gospodării montate

82,6% executate (8 stații de pompare din 2 proiecte de dezvoltare regională)

Construcția 1 bloc de tratare biologică de 2500 m³/24h – 46,7%

30 % din construcția halei multifuncționale de producere

53 % din clopotnița germană reconstruită



Principali indicatori obținuți în realizare politicii de dezvoltare regională pentru perioada ianuarie-iunie 2024

2 castele de apă de 50 m3 construite

1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat

1 act de predare-primire elaborat

1 raport final elaborat

1 raport post implementare elaborat

1 ședințe CRD Sud desfășurate cu aprobarea a 5 Decizii

1 atelier de instruire pentru membrii CRD Sud cu privire la cadrul normativ și instituțional de implementare a politicii naționale de dezvoltare regională

Componenta Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud de legislatura a IV-a actualizată;

3 cereri de finanțare elaborate și depuse în cadrul apelului pe listă de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație cu finanțare din sursele FNDRL;

Participarea în cadrul grupului sectorial de lucru 22 „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”

Contractarea (cu suportul GIZ) a serviciilor de definitivare a Studiului de specializare inteligentă a RDS



Principali indicatori obținuți în realizare politicii de dezvoltare regională incluse în POR 2022 – 2024 pentru perioada ianuarie-iunie 2024

Cartografierea proiectelor implementate în RDS pe domeniile de intervenție aferente politicii naționale de dezvoltare regională cu finanțare alta decât FNDRL

Consultanță oferită APL urbane din RDS cu privire la cadrul metodologic de evaluare și elaborare/actualizare a Programelor de revitalizare urbană

Colaborarea cu partenerii de dezvoltare Banca germană de dezvoltare KfW și Solidarity Fund PL în Moldova în scopul atragerii investițiilor în RDS

168 Cereri de Finanțare aferente Programului Național „Satul European” examinate și avizate

Facilitarea participării APL în cadrul apelurilor de proiecte aferente Programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate de Uniune Europeană

5417 Beneficiari contactați telefonic în cadrul Programului EcoVoucher finanțat de UE aferent proiectului „Abordarea crizei energetice în RM”

Promovarea RDS, ADR Sud, CRD Sud și a proiectelor implementate în cadrul evenimentelor „Ziua profesională a autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală” și Conferința finală de încheiere a Programului România-RM 2014-2020

Celebrarea „Ziua Europei 2024”

12 activități de consolidare a capacităților pentru specialiștii ADR Sud, APL și actorii regionali

Asigurarea transparenței și vizibilității ADR Sud



Riscuri și provocări

**Disponibilitatea redusă
a datelor statistice**

**Insuficiența
mijloacelor financiare
pentru promovarea
Regiunii de Dezvoltare
Sud**

**Calitatea slabă a
documentației tehnice,
care necesită deseori
revizuri, astfel
afectând procesul de
implementare a
proiectelor.**

**Tergiversarea
procedurilor de
achiziții publice**



MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agenția de
Dezvoltare Regională
Sud

Vă mulțumim pentru atenție!

bd. Ștefan cel Mare, 12,
Orașul Cimișlia,
Republica Moldova, MD-4101

Tel. +373 241 2 62 86
Email: adrsud@adrsud.gov.md
Web: www.adrsud.md
