




Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului




Agencia de
Dezvoltare Regională
Sud

Prezentat pentru coordonare: _____


Maria CULEȘOV
Director



**RAPORT ANUAL
PRIVIND IMPLEMENTAREA
PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNI
al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
pentru anul 2020**

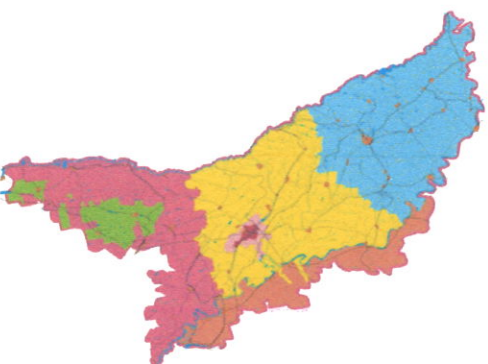

APROB: 
Chenadie IURCO,
Secretar de Stat

“ ” _____ 2021

Acțiuni	Sub-acțiuni	Termen de realizare, tr.			Respon sabili	Indicatori de progres	Nivelul de realizare
		I	II	III IV			
POLITICI REGIONALE ȘI COOPERARE EXTERNĂ							
1.1.	Evaluarea intermediară a implementării POR Sud 2017-2020	Analiza gradului de implementare a POR Sud 2017-2020	Trim. IV	SPRCE	1 raport de analiză elaborat	Realizat parțial: Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate diverse activități de analizare a gradului de implementare a POR 2017-2020. Indicatorul de progres stabilit nu a fost posibil de atins pe motiv că raportul de analiză poate fi elaborat doar după expirarea termenului documentului, deci acesta va fi elaborat în primul trimestru al anului 2021	
1.2.	Revizuirea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS Sud	Analiza gradului de realizare a planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS	Trim. III	SPRCE	3 rapoarte de analiză elaborate	Realizat parțial: Pe parcursul perioadei de raportare au fost examinate PRS- le din RDS. Având ca bază noul Concept al politicii de dezvoltare regională, în care se regăsesc alte domenii investiționale de intervenție organizate în 3 Programe de Finanțare, s-a constatat că 3 PRS-uri din cele aprobate la nivel de regiune nu mai sunt aplicabile acțiunilor Actorilor implicați în domeniul dezvoltării regionale. Totodată de menționat că oficial au fost adresate solicitări către MADRM și GIZ pentru a obține suport normativ și metodologic privind activitatea de evaluare a documentelor de program, inclusiv prin elaborarea unor modele tip de rapoarte. Din discuții cu reprezentanții MADRM și GIZ în prezent este la etapă de finalizare cadrul normativ menționat de evaluare a politicilor de dezvoltare regională, și proiectelor implementate în regiune cu elaborarea unor modele tipizate de rapoarte.	
	Actualizarea Planurilor de acțiuni privind implementarea PRS din RDS		Trim. III	SPRCE	3 planuri de acțiuni revizuite	Realizat parțial: au fost studiate toate cele 6 PRS dintre care pentru 3 PRS au fost revizuite și a început procesul de colectare a datelor și indicatorilor necesari pentru actualizarea planurilor	

1.3.	Participare în implementarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare prin utilizarea tehnologiei GIS"	Participarea în instruirea organizate în cadrul proiectului	Trim. I	SPRCE	1 sesiuni de instruire desfășurate, 7 participanți	Realizat parțial: În perioada vizată au fost preconizate două sesiuni de instruire privind utilizarea tehnologiei GIS. Cea de-a șasea sesiune de instruire din cadrul proiectului s-a desfășurat în intervalul 11-13 februarie 2020, cu participarea a 7 specialiști din cadrul ADR Sud. În urma instruirii date, specialiștii din cadrul Agenției au avut ca temă pentru acasă colectarea unui set de indicatori și utilizarea acestora în crearea unui poster, a unei hărți, aceasta fiind considerată drept o idee de proiect. În cadrul celei de-a șaptea sesiuni de instruire, planificată pentru perioada 16-18 martie 2020, aceasta fiind de fapt ultima din acest proiect, participanții urmau să beneficieze de suport și consultanță privind punerea în practică a cunoștințelor însușite pe întreaga durată a cursului și să obțină, ca rezultat final, un poster/hartă, creat pe baza indicatorilor colectați. Dar, din cauza pandemiei COVID-19 și declarării în R. Moldova a stării de urgență, ultima instruire din cadrul cursului nu a fost posibil de realizat. Activitatea respectivă va fi, probabil, transferată pentru o altă perioadă a anului. În proces de realizare: În vederea realizării acțiunii respective și a colectării datelor, ADR Sud, prin scrisorile oficiale cu nr. 233-241 din 20 martie 2020, a solicitat de la autoritățile administrației publice locale de niv. I și II informația ce vizează implementarea proiectelor în perioada anilor 2015-2020 cât și a proiectelor în curs de implementare. La moment suntem în proces de recepționare a informației solicitate și studierea acesteia pentru a putea crea o bază de date a proiectelor locale/regionale/transfrontaliere/transnaționale implementate în regiune. Deasemenea, pe baza informației recepționate de la APL de niv. I și II, vom crea un set de indicatori și îi vom încadra în sistemul GIS. În scopul elaborării hărților cu vectorizarea rețelelor de apă și canalizare, electricitate și gaz pentru 6 localități (Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat), Agenția a
		Colectarea și verificarea datelor pilot care vor fi utilizate în sistemul GIS.	Trim. I-II	SPRCE	Set de indicatori colectați și încadrați în sistem	

		Utilizarea instrumentelor GIS în planificarea regională. Elaborarea hărților tematice.	Trim. IV	SPRCE	1 mecanism GIS testat Nr. hărți elaborate	venit cu solicitare către APL Cahul de niv. I și II, de a prezenta informația pentru domeniile: 1. Rețele de alimentare cu apă; 2. Rețele de canalizare; 3. Rețele electrice; 4. Rețele de gazoduct, cu următoarele aspecte: a) existența documentației de proiect b) forma acestei documentației de proiect (electronic sau pe suport de hârtie) c) alte aspecte privind disponibilitatea informației asupra domeniilor menționate mai sus Realizat: în perioada raportată a fost elaborat o hartă GIS ce reflectă progresul de implementare a proiectelor în RDS în domeniul AAC prin crearea condițiilor de infrastructură de bază pentru sporirea condițiilor de trai a populației din localitățile regiunii. Astfel în urma realizării obiectivului propus, un specialist din cadrul ADR va obține certificarea în domeniul elaborării hărților GIS
1.4.	Planificarea activității ADR Sud	Elaborarea și prezentarea spre aprobare CRD Sud a Planului de implementare a SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2020	Trim. I	SPRCE	1 plan anual aprobat de CRD Sud	Realizat: Planul de implementare a SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2020, a fost elaborat și prezentat MADRM pentru coordonare. Ulterior, documentul a fost prezentat membrilor CRD Sud, în cadrul ședinței de constituire din data de 23 ianuarie, și a fost aprobat prin Decizia nr. 1/05 din 23.01.2020. Totodată, membrii CRD Sud au luat act de Planul anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2020.
		Elaborarea și prezentarea spre aprobare MADRM a Planului de activitate al ADR Sud pentru anul 2020	Trim. I	SPRCE	1 plan anual aprobat de MADRM	Realizat: Planul anual de acțiuni al ADR Sud pentru anul 2020 a fost elaborat și prezentat, spre coordonare și aprobare, către MADRM, în termenii stabiliți.
1.5.	Monitorizarea și raportarea implementării documentelor de politici regionale	Aplicarea sistemului de M&E bazat pe rezultate pentru monitorizarea implementării SDR Sud 2016-2020 și POR Sud 2017-2020	Trim. I, III	SPRCE	1 bază de date cu indicatori actualizată	Realizat: În trimestrul I și III al anului curent, în vederea monitorizării implementării SDR Sud 2016-2020, pentru anul 2019, a fost colectată informația necesară și actualizată baza de date cu indicatori. Această bază de date a fost anexată la Raportul semestralului I și Raportul de progres anual de progres privind implementarea SDR (Anexa 1) și conține 9 de indicatori ce măsoară gradul de progres.

	Elaborarea rapoartelor semestrial și anual privind implementarea SDR Sud și prezentarea către MADRM și CRD Sud	Trim. I, III	SPRCE	2 rapoarte elaborate și prezentate CRD și MADRM	Realizat: În trimestrul I de activitate a fost prezentat spre aprobare către MADRM Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru anul 2019 În trim. III de activitate a fost prezentat spre aprobare către MADRM Raportul de progres privind implementarea SDR Sud 2016-2020 pentru semestrul I 2020. Raportul privind implementarea SDR (sem. I) a fost prezentat membrilor CRD în cadrul ședinței. Totodată, au fost realizate prezentările necesare la ședință.
	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind implementarea planului anual de acțiuni al ADR Sud și prezentarea către MADRM	Trim. I-IV	SPRCE	4 rapoarte elaborate și prezentate MADRM	Realizat: În perioada vizată, au fost elaborate și prezentate către MADRM, în termenii stabiliți, 4 rapoarte trimestriale al Agenției de Dezvoltare Regională Sud pentru perioada de activitate Trim. IV 2019 și trimestrele I-III 2020.

II. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

2.1.	Implementarea proiectului ”Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție (etapa II, Stația de epurare)	Trim. I-II	SFA	1 proceduri AP desfășurate 1 contract semnat	Realizat: Activitatea dată a fost realizată pe parcursul trim. I. Procedurile de achiziționare a lucrărilor pentru proiectul dat au fost desfășurate pe parcursul anului 2019. Contractul de antepriză a fost semnat la 14.02.2020. Compania de construcții căreia i-a fost atribuit contractul: SRL „IZODROMGAZ”. Valoarea contractului: 46 080 000,00 (patruzeci și șase milioane optzeci mii lei, 00 bani) MDL, inclusiv TVA.
	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului (etapa II, Stația de epurare)		Trim. I-IV	SMP	29 vizite de monitorizare efectuate 16 ședințe desfășurate 4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM	Realizat: Pe parcursul anului au de către specialiștii ADR Sud au fost efectuate 29 vizite de monitorizare. Pentru soluționarea diverselor probleme și aspecte specifice realizării procesului de construcție au fost desfășurate 16 ședințe de lucru. Ca rezultat trimestrial au fost elaborate 4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM

2.2.	Implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 Sîrma – Tomai – Sărăteni - Hirtop la rețeaua de drumuri naționale R3”	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim. I-II	SMP	1 act de predare-primire semnat	Realizat: La data de 27.05.2020 au fost transmise către beneficiar costurile investiționale formate în urma implementării proiectului în baza Actului de predare-primire nr. 20 din 19.05.2020.
		Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim. III	SMP	1 raport elaborat și transmis în termen	Realizat: La data de 15.09.2020 a fost transmis raportul final a proiectului în adresa MADRM.
2.3.	Implementarea proiectului ”Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”	Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim. I-IV	SMP	19 vizite de monitorizare efectuate 15 ședințe desfășurate 4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM	Realizat: Pe parcursul anului au de către specialiștii ADR Sud au fost efectuate 19 vizite de monitorizare. Pentru soluționarea diverselor probleme și aspecte specifice realizării procesului de construcție au fost desfășurate 15 ședințe de lucru. Ca rezultat trimestrial au fost elaborate 4 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim. IV	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	În proces de realizare: Activitatea planificată se va realiza în perioada trimestrului I anul 2021. Motivul: din cauza situației epidemiologice din țară, lucrările de construcție au fost executate într-un proces mai lent cu unele restricții, respectând distanța socială ș.a.
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	Trim. IV	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Ne realizat: Activitatea planificată se va realiza în perioada trimestrului I - II, anul 2021 Motivul: deoarece nu a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliți.

2.4.	Implementarea proiectului ” Reabilitarea termică a IMSP Spitalul raional Cantemir” (bloc chirurgical)	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului	Trim. I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: La data de 19.05.2020 a fost organizat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor a obiectului.
		Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	Trim. I-II	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 19.05.2020 a fost organizat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor a obiectului.
		Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim. II-III	SMP	1 act de predare-primire semnat	Realizat: La data de 04.12.2020 a fost transmis actul de predare a proiectului în adresa MADRM.
		Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim. II-III	SMP	1 raport elaborat și transmis în termen	În proces de realizare: Activitatea planificată se va realiza în perioada trimestrului I, anul 2021 Motivul: inițial din cauza epidemiologie din țară, a fost o problemă de durată pentru semnarea Actului dat de către conducerea raionului Cantemir. După ce la data de 04.12.2020 Actul a fost transmis către MADRM, în urma verificării de către contabilitatea MADRM, au fost solicitate unele modificări în cadrul Actului dat și respectiv acesta a fost returnat pentru contrasemnarea repetată.
2.5.	Implementarea proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților, Sîrna, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim. II-III	SFA	2 proceduri AP desfășurate 2 contracte semnate	Realizat: În urma desfășurării proceduri de achiziții publice prin Licitatie deschisă în vederea achiziționării lucrărilor de construcții, la data de 24.12.2020 a fost semnat contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcție. În urma desfășurării proceduri de achiziții publice prin Cererea Ofertelor de Prețuri în vederea achiziționării serviciilor de supraveghere tehnică asupra lucrărilor, la data de 10.11.2020 a fost semnat contractul privind supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție.
		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție în cadrul proiectului	Trim. IV	SMP	1. vizită de monitorizare efectuată 1. ședință	În proces de realizare: Activitatea planificată urmează a fi realizată în perioada anului 2021.

					desfășurată 1 raport de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM	Motivul: Ca urmare a organizării licitației pentru lucrările de construcție și a serviciilor pentru supraveghere tehnică au parvenit contestații din partea ofertanților, iar soluționarea lor a durat timp îndelungat, fapt ce a și provocat transferarea activității pentru anul următor.
2.6.	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție la terminarea lucrărilor	Trim. I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Realizat: La data de 11.03.2020 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor.	
Implementarea proiectului ”Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca”	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală în cadrul proiectului	Trim. I-II	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 27.03.2020 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție finală a lucrărilor. Respectiv, a fost semnat actul de recepție finală.	
	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim. III	SMP	1 act de predare- primire semnat	Realizat: La data de 15.04.2020 au fost transmise către beneficiar costurile investiționale formate în urma implementării proiectului „Construcția drumului de acces spre mănăstirea Chistoleni, raionul Basarabeasca” în baza Actului de predare-primire nr. 21 din 31.03.2020.	
	Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim. IV	SMP	1 raport elaborat și transmis în termen	Realizat: La data de 19.08.2020 a fost transmis raportul final a proiectului în adresa MADRM	
	Organizarea și desfășurarea evenimentului de recepție finală	Trim. I	SMP	1 eveniment desfășurat 1 act de recepție finală semnat	Realizat: La data de 30.12.2019 a fost organizat și desfășurat evenimentul de recepție finală a obiectului.	
2.7.	Implementarea proiectului MSPL Cahul: Măsura investițională 2 ”Construcția apeductului magistral Cahul - Lebedenco - Pelinei - Găvănoasa – Vulcănești - Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare”	Transmiterea costurilor investiționale formate către aplicant	Trim. I	SMP	2 acte de predare-primire semnat	Realizat: La data de 13.01.2020 au fost semnate actele de predare- primire a costurilor investiționale formate cu nr. 17 și 18 din 13.01.2020.
		Elaborarea raportului final pe proiect și transmiterea MADRM	Trim. II	SMP	2 rapoarte elaborate și transmise în termen	Realizat : La data de 02.06.2020 de către beneficiar(Consiliul Raional Cahul) au fost preluate costurile investiționale pentru ETAPA I, FAZA1, în baza Deciziei consiliului raional

	(ETAPA I, Faza I și Faza 2)				nr.02/23-V din 02.06.2020. Iar la data de 18.06.2020 a transmis raportul final către MADRM. Ulterior la data de 21.07.2020 de către beneficiar(primăria com.Lebedenco) au fost preluate costurile investionale pentru ETAPA I, FAZA2, în baza Deciziei consiliului local nr.4/25 din 21.07.2020. Iar la data de 21.08.2020 a transmis raportul final către MADRM.
2.8.	Implementarea proiectului MSPL finanțat din sursele Uniunii Europene în domeniul AAC și EE	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru lucrări de construcție	Trim. II-III	SFA	9 proceduri AP desfășurate 13. contracte semnate
					Realizat: În perioada de raportare au fost desfășurate 9 proceduri de achiziții publice, dintre care: - 2 LP pentru lucrări EE; - 2 LP pentru lucrări AAC; - 2 LP pentru servicii de supraveghere tehnică EE; - 2 LP pentru servicii de supraveghere tehnică AAC; - 1 COP achiziționarea automobilului. Totodată, a fost semnat contractul de achiziționare a unui automobil. Au mai fost semnate următoarele contracte: - Contract nr.03/L/20/GIZ EE Leova din 18.08.2020 - Contract nr.05/S/20/GIZ SRT EE Leova din 18.08.2020 - Contract nr.22/S/20/GIZ Drept autor EE Leova din. 20.08.2020 - Contract nr.04/L//GIZ Canalizare din or. Leova din 18.08.2020 - Contract nr.04/S/20/GIZ SRT Canalizare din or. Leova din 18.08.2020 - Contract nr.21/S/20/GIZ Drept autor Canalizare din or. Leova din 20.08.2020 - Contract nr.05/L/20/GIZ AAC 4 localități din or. Leova din 25.09.2020 - Contract nr.06/S/20/GIZ SRT AAC 4 localități din or. Leova din 25.09.2020 - Contract nr.23/S/20/GIZ Drept autor AAC 4 localități din or. Leova din 25.09.2020 - Contract nr.06/L/20/GIZ EE Basarabasca din 28.09.2020 - Contract nr.07/S/20/GIZ SRT EE Basarabasca din 28.09.2020

		Monitorizarea implementării lucrărilor de construcție	Trim. III-IV	SMP	37 vizite de monitorizare efectuate 15 ședințe desfășurate 8 rapoarte de monitorizare pe proiect elaborate și transmise MADRM	Contract nr.24/S/20/GIZ Drept autor EE Basarabasca din 28.09.2020 Realizat: În perioada de raportare au fost organizate: 37 vizite la proiectul EE LT Leova, AC din or. Leova, AA din 4 localități din raionul Leova precum și proiectul EE LT Basarabasca fiind desfășurate 15 ședințe de lucru. Au fost elaborate și aprobate 8 rapoarte de monitorizare pe aceste proiecte și expediate către MADRM.
III. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR DE DEZVOLTARE REGIONALĂ						
3.1	Planificarea instruirilor	Elaborarea și prezentarea MADRM a Planului anual de instruiri pentru anul 2020	Trim. I	SPRCE	1 plan anual de instruiri elaborat	Realizat: În perioada de raportare a fost elaborat și prezentat către MADRM Planul anual de instruiri pentru anul 2020.
3.2.	Instruirea reprezentanților instituțiilor de dezvoltare regională în domeniile aferente obiectivelor strategice	Participarea specialiștilor ADR Sud în activități de formare profesională continuă Facilitarea participării membriilor CRD Sud în activități de instruire organizate de Academia de Administrare Publică	Trim. I-IV Trim. IV	SPRCE SPRCE	16 sesiuni desfășurate 48 participanți 3 sesiuni desfășurate 12 participanți	Realizat: 48 specialiști ai ADR Sud au beneficiat de instruirii în cadru la 16 sesiuni de instruire pe diverse tematici Realizat: Specialiștii SPDR au facilitat procesul de participare a membriilor CRD Sud la 3 instruiri ce au fost organizate de către AAP. Astfel, membrii CRD au fost informați despre tematicile cursurilor, modalitatea/perioada de desfășurare a acestora și au primit tot suportul necesar în accesarea platformelor de predare. Totodată, la cursuri au participat și 2 specialiști din cadrul ADR Sud.
		Participare în cadrul forumului deschis privind guvernanta locală și dezvoltarea regională organizat de AAP	Trim. III	SPRCE AAP	2 forumuri desfășurate Nr. participanți	Ne realizat : Motivul: Din cauza stării pandemice creată de virulul COVID-19, organizarea forumului deschis privind guvernanta locală a fost amânat pentru trimestrul II al a. 2021
3.3.	Dezvoltarea capacităților	Facilitarea participării membriilor CRS Sud și a	Trim. III	SPRCE	Nr. sesiuni desfășurate Nr. participanți	În proces de realizare: În perioada de raportare nu au fost desfășurate măsuri de instruire ale membrilor CRS dat fiind faptul că acestea, la

membrii CRS AAC și MDS	grupurilor de lucru în activități de instruire					etapa respectivă, nu au fost constituite de către noua componentă a CRD Sud. Abia la finele lunii noiembrie 2020, membrii CRD Sud au decis asupra constituirii a 2 comisii regionale sectoriale în domeniile Alimentare cu Apă, Canalizare și Infrastructură și Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană.
	Facilitarea participării membrilor CRS MDS în identificarea priorităților de bază pentru dezvoltarea capacităților	Trim. III	SPRCE	1 listă de priorități de instruire întocmită pentru formarea modulelor		În proces de realizare: În perioada de raportare nu au fost desfășurate măsuri de instruire ale membrilor CRS dat fiind faptul că acestea, la etapa respectivă, nu au fost constituite de către noua componentă a CRD Sud. Abia la finele lunii noiembrie 2020, membrii CRD Sud au decis asupra constituirii a 2 comisii regionale sectoriale în domeniile Alimentare cu Apă, Canalizare și Infrastructură și Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană.
3.4.	Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, operatori de servicii, etc.)	Facilitarea implementării planurilor de dezvoltare a capacităților operatorilor de servicii de AAC din raioanele Cahul și Leova	Trim. IV	SMP	3 sesiuni desfășurate 37 participanți	Realizat: Specialiștii ADR împreună cu operatorii de servicii de AAC au participat la ședințele de lucru și la instruirile organizate de partenerii finanțatori
	Facilitarea diseminării în RDS a lecțiilor învățate din planificarea locală participativă în sectorul EE a clădirilor publice	Trim. II	SMP	7 sesiuni desfășurate 151 participanți		Realizat: Au fost desfășurate 2 ateliere de lucru cu echipele de management energetic al Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova și al Liceului Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca, în cadrul cărora au fost identificate oportunitățile de economisire a energiei și s-au discutat planurile de management energetic al liceelor respective, total participanți 29, dintre care 14 bărbați și 15 femei. La data de 28.01.2020 și 17.01.2020 au avut loc ateliere de lucru cu cadrele didactice privind desfășurarea Orei Energiei în baza măsurilor EE planificate spre implementare în cadrul proiectelor de eficiență energetică. În cadrul acestor ateliere au participat 42 persoane, dintre care 4 bărbați și 38 femei. La data de 26 februarie 2020, în cadrul orelor de Dezvoltare personală s-au desfășurat 3 activități publice de Eficiență

						Energetică pentru clădirile publice în baza proiectului cu finanțare UE „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Constantin Spătaru din or. Leova”, total participanți 80: elevi, profesori, invitați.
3.5.	Facilitarea organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS	Preluarea bunelor practici prin intermediul vizitelor de studiu	Trim. III	SPRCE	nr. vizite de studiu nr. beneficiari	Ne realizat: Motivul: În conformitate cu restricțiile impuse de pandemia Covid 19, procesul de facilitare a organizării și desfășurării vizitelor de studii pentru actorii de dezvoltare regională din RDS nu a fost posibil de realizat cu prezența fizică. Toate activitățile au fost realizate prin intermediul platformelor online.
3.6	Raportarea instruirilor	Raportarea asupra implementării planului anual de instruire	Trim. I, III	SPRCE	2 rapoarte elaborate	Realizat: În perioada vizată au fost elaborate și prezentat către MADRM, conform solicitărilor două Rapoarte a activităților desfășurate privind dezvoltarea capacităților specialiștilor ADR Sud pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie 2020.

IV. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE ȘI ATRAGEREA INVESTIȚIILOR

4.1.	Cooperarea cu partenerii de dezvoltare pentru atragerea investițiilor în RDS	Participarea în procesul de implementare în RDS a Programului „Comunitatea mea” lansat de USAID.	Trim. I-IV	SPRCE	23 APL din RDS beneficiare	Realizat: În trim II, Programul „Comunitatea Mea” a organizat o masă rotundă: “Gestionarea Deșeurilor Solide: Provocări și Soluții pentru autoritățile locale”, cu scopul de a reuni actorii cheie în domeniul MDS din RM și a discuta despre procesul de gestionare a deșeurilor din țară, precum și despre rolul APL și APC în acest proces. La eveniment au participat 29 de invitați, printre care și directorul ADR Sud. Urmează ca programul să identifice cele mai bune strategii pentru consolidarea capacităților APL-urilor în gestionarea durabilă a deșeurilor în Moldova. De asemenea specialiștii secției SPRCE au participat la 3 ateliere de elaborarea a strategiilor de dezvoltare locale împreună cu APL parteneri ai USAID ” Comunitatea Mea” (primăria s. Gura Galbenă, s. Mingir, or. Cimișlia)
	Participare în procesul de implementare în RDS a inițiativei „Primari pentru		Trim. I-IV	SPRCE	5 instruiiri frecventate 48 APL din	Realizat: În baza disponibilității oficializate de cooperare în RDS a Inițiativei „Primari pentru creștere economică” un specialist din cadrul Agenției a participat la o ședință în

	creșterea economică” finanțat de UE			RDS beneficiare 48 APL consultate	cadrul căreia au fost analizate rezultatele sondajului privind evaluarea impactului și reacției la COVID-19 al partenerilor Inițiativei. La sesiună au fost prezenți reprezentanți ai APL de niv. I și II precum și reprezentanți ai sectoarelor economiei reale, care au fost consultați și au analizat prioritățile locale. În urma Concursului de proiecte cu finanțare din FNDR lansat de către MADRM, la data de 08.09.2020, reprezentanții inițiativei „Primarii pentru creșterea economică” au organizat o sesiune de discuții (orientare) privind ideile de proiecte regionale, pentru măsura 1.3 Sporirea atractivității turistice, în format online. Cu idei și sfaturi, în cadrul discuțiilor au contribuit și specialiștii ADR Sud. În perioada de raportare specialiștii secției SPRC au participat la 3 ateliere de lucru în cadrul cărora au fost studiate 5 module privind agricultura de dezvoltare locală, și valorificarea segmentelor competitive de pe piața turismului, de asemenea am participat la evenimentul final de raportare a activităților din ultimii 4 ani de activitate a Inițiativei M4EG și obiectivele propuse pentru următorii 4 ani.	
4.2.	Conlucrarea cu APL din RDS în vederea atragerii investițiilor în regiune	Informarea APL despre apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și fonduri de finanțare	Trim. II-IV	SPRCE	43 apeluri mediatizate	Realizat : Prin intermediul Calendarului Lansării Apelurilor de Proiecte plasat pe pagina www.adrsud.md , ADR Sud a mediatizat și promovat în rândul APL-urilor din regiune apelurile de propuneri de proiecte lansate de către donatori și alte fonduri de finanțare.
	Promovarea cooperării intercomunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale	Promovarea cooperării intercomunitare pentru elaborarea și aplicarea proiectelor regionale	Trim. I-IV	SPRCE	45 parteneriate formalizate	Realizat: Promovarea cooperării intercomunitare a fost realizată prin intermediul noului apel de propuneri de proiecte. Astfel, pentru a elabora proiecte regionale și a aplica NC în cadrul apelului, APL-urile din regiune au creat parteneriate publice. ADR Sud a fost instituția care a promovat și încurajat menținerea acestor parteneriate prin oferirea consultațiilor.

	Participarea ADR Sud în activități de promovare a regiunii ca destinație pentru investiții, cu prezentarea materialelor promoționale interesante pentru potențialii investitori	Trim. III-IV	SPRCE	2 evenimente cu participarea ADR desfășurate Profilurile investiționale raionale și Catalogul investițional regional promovate în rândul potențialilor investitori	Realizat: ADR Sud a participat la Evenimentul de inițiere pentru OSC-urile Finaliste privind Procedurile de implementare a proiectelor din cadrul PGL informând despre activitățile Agenției și a promovat RDS (Organizator Centrul Contact-Cahul). Directorul ADR a participat la evenimentul de lansare a proiectelor investiționale din partea UE, în cadrul forumului organizat de Centrul Contact-Cahul, unde a încurajat OSC-urile și alți membri ai domeniului de dezvoltare regională să participe activ la promovarea regiunii și a exprimat deschiderea spre oferirea suportului necesar în promovarea valorilor regiunii sud.
4.3.	Promovarea regiunii ca destinație pentru investiții	Participarea în calitate de partener în cadrul evenimentelor (conferințe, forumuri, expoziții) desfășurate în regiune.	Trim. I-IV	SPRCE 8 evenimente 0 materiale promoționale distribuite	Realizat parțial: În ianuarie 2020, 2 specialiști ADR Sud au participat la Forumul Internațional de Afaceri „Moldova 2020 - conturarea viitoarei cooperări internaționale de afaceri”, unde au prezentat informații privind situația economică și potențialul investițional al RDS a RM. de către ADR Sud nu au fost repartizate materiale promoționale. În trim IV, specialiștii ADR Sud au participat la evenimentul “Invest Moldova, Business week” și la Forumul dedicat promovării Rutei culturale turistice “Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt”, Adunarea de constituire a Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană - în cadrul proiectului Solidarity Fund PI in Moldova cu suportul Polish Aid, eveniment de lansare a studiilor cu privire la promovarea politicilor de mediu organizat de ExpertGrup, webinarele organizate de EURADA privind implicarea antreprenoriatului social sustenabil în Europa. În calitate de parteneri am participat la evenimentul de lansare a lucrărilor de construcție pentru proiectele de alimentare cu apă și canalizare (AAC) și de eficiență energetică (EE) finanțate din fondurile UE.

V. VIZIBILITATE, COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

5.1.	Dezvoltarea rețelelor de informare și comunicare privind activitatea instituțiilor de dezvoltare regională și promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Sud	Actualizarea paginii Web a ADR Sud	Trim. I-IV	SPRCE	177 articole publicate 765134 vizualizări	Realizat: În perioada vizată, pe pagina web a ADR Sud au fost plasate 177 de articole care vizează activitatea instituției, evenimentele desfășurate în RDS, apelurile și programele de finanțare deschise, inclusiv anunțuri și invitații de participare la licitațiile publice lansate în cadrul proiectelor aprobate în DUP 2017-2020, a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul GLZ, și în curs de implementare. Pe pagina web a ADR Sud au fost înregistrate în perioada de referință 765134 de vizualizări.
5.2.	Organizarea evenimentelor de promovare a regiunii (conferințe, forum, expoziții, festivaluri)	Întreținerea contului facebook al ADR Sud	Trim. I-IV	SPRCE	325369 impact persoane	Realizat: Pe contul Facebook al ADR Sud au fost afișate 639 de postări ale comunicatelor, avizelor și altă informație relevantă pentru actorii din Regiune (APL, ONG, mass-media etc.), care au avut un impact de 325369 de vizualizări
		Mediatizarea și asigurarea vizibilității activității ADR Sud, a proiectelor de dezvoltare regională și a evenimentelor din RDS prin intermediul mass - media și a panourilor informative din cadrul CR din RDS	Trim. I-IV	SPRCE	105 de evenimente mediatizate 46 de publicații afișate	Realizat: Întru atingerea obiectivului dat, în perioada de raportare au fost realizate următoarele: 105 evenimente mediatizate 46 publicații afișate 4 buletine informative editate și afișate 31 de actualizări efectuate la panourile informative 263 comunicate elaborate 160 reportaje TV și Radio 232 articole în presa scrisă și electronică locală și națională
		Participare în calitate de partener la organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale de anvergură din RDS (Parada Florilor, Festivalul Piersicului, Ziua Dunării, etc.)	Trim. I-IV	SPRCE	0 eveniment desfășurate 250 de materiale promoționale distribuite	Realizat parțial: În perioada de raportare, în contextul situației epidemiologice din țară, în RDS nu au fost organizate și desfășurate evenimente culturale de anvergură. Astfel, ADR Sud nu a avut ocazia să participe, la niciun eveniment de acest fel. În pofida acestui fapt, ADR Sud a reușit să organizeze un atelier de lucru privind fortificarea rolului CRD Sud și o ședință ordinară a CRD Sud. Atelierul și ședința CRD Sud au fost organizate în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din

					Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de de ADR Sud cu suportul financiar al proiectului MSP, implementat de GIZ Moldova. La evenimentele ADR Sud a distribuit membrilor CRD Sud, reprezentanților MADRM și altor parteneri 250 de materiale promoționale (calendare, agende, carnețe, pungi, mape, pixuri și măști personalizate).
	Organizarea evenimentului „Ziua Europei”	Trim. II	SPRCE	1 eveniment desfășurat 2 articole tematiche elaborate 2 galerii foto elaborate	Realizat: În legătură cu epidemia provocată de COVID-19, anul acesta „Ziua Europei” a fost sărbătorită online. A fost realizat un clip video, prin care au fost promovate și mediatizate proiectele implementate în RDS cu suportul financiar al UE. A fost elaborată o prezentare PPT, prin care ADR Sud a promovat valorile, obiectivele și simbolurile UE, precum și rezultatele investițiilor realizate cu suportul UE în infrastructură. De asemenea ADR Sud a promovat activ pe pagina sa oficială proiectele cu finanțare din fondurile UE, notificând realizările obținute la acest moment și activitățile desfășurate printr-o galerie foto cu imagini de la obiectivele construite pe parcursul celor 10 ani de activitate și de la evenimentele desfășurate la nivel regional în contextul celebrării Zilei Europei.
	Organizarea și desfășurarea evenimentului ”ADR Sud - 10 ani de Dezvoltare Regională”	Trim. I	SPRCE	1 eveniment desfășurate Nr. de participanți	Ne realizat: Motivul: În contextul situației epidemiologice din țară și a stării de urgență instituită prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020, evenimentul „ADR Sud - 10 ani de Dezvoltare Regională” a fost contramandat.
	Organizarea sesiunilor de informare ”INFO DAY” pentru promovarea dezvoltării regionale	Trim. I-II	SPRCE	5 sesiuni desfășurate 130 participanți	Realizat: Din trim. II de activitate, ADR Sud a inițiat procedura de organizare a sesiunilor de informare „INFO DAY”. Astfel au fost organizate 5 sesiuni de informare la care au participat circa 130 de persoane, printre care primari și președinți de raioane, secretari ai consiliilor locale, reprezentanți ai Direcțiilor economie și atragerea investițiilor, membri CRD Sud ș.a. Evenimentele au avut

					drept scop familiarizarea APL și altor actori cu conceptul dezvoltării regionale, cadrul legal, instituțional, rolul, atribuțiile și importanța ADR Sud, a CRD Sud, promovarea proiectelor implementate pe parcursul celor 10 ani de activitate a Agenției, precum și furnizarea de informații relevante vizavi de noul apel de propuneri de proiecte.
	Elaborarea și distribuirea buletinului informativ trimestrial al ADR Sud ”Dezvoltarea regională”	Trim. I-IV	SPRCE	4 buletine elaborate Și distribuite	Realizat: În perioada de referință au fost elaborate 4 buletine electronice informative “Dezvoltare regională, acestea fiind distribuit la un număr de circa 2400 de beneficiari. Totodată, buletinul informativ a fost plasat pe site-ul ADR Sud și distribuit pe rețelele de socializare.
5.3	Elaborarea și editarea materialelor informativ și promoționale	Trim. III-IV	SPRCE	100 agende 100 carnete 100 măști 100 pixuri 1 banner roll-up	Realizat: În perioada de referință, pentru promovarea imaginii sale în particular, precum și a CRD Sud și a dezvoltării regionale în ansamblu, conform Planului său de activitate, ADR Sud a elaborat și editat mai multe materiale promoționale, printre care: agende, calendare, carnete, banner roll-up, măști etc.

VI. ACTIVITATE OPERAȚIONALĂ

6.1.	Asigurarea secretariatului CRD Sud	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRD Sud	Trim. I-IV	SPRCE	4 ședințe CRD desfășurate cu succes Rata de participare a membriilor CRD la ședințe, 78,4%	Realizat: În perioada de referință au fost desfășurate 4 ședințe ale CRD dintre care 2 în format on-line. În cadrul acestor ședințe au fost aprobate 19 decizii Rata medie de participare a fost de 78,4%
6.2.	Asigurarea secretariatului CRS Sud	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare ale CRS în domeniul AAC	Trim. III-IV	SPRCE	ședințe desfășurate cu succes PV ale ședințelor întocmite și distribuite la membrii CRS;	Ne realizat: În perioada de raportare nu au fost desfășurate ședințe ale CRS AAC dat fiind faptul că acestea, la etapa respectivă, nu au fost constituită de către noua componență a CRD Sud. Abia la finele lunii noiembrie 2020, membrii CRD Sud au decis asupra constituirii a 2 comisii regionale sectoriale în domeniile Alimentare cu Apă, Canalizare și Infrastructură și Dezvoltare Economică, Turism și Dezvoltare Urbană.

				Rata de participare a membrilor CRS la şedinţe, %	
	Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare a CRS în domeniul MDS	Trim. III-IV	SPRCE	şedinţe desfăşurate cu succes PV ale şedinţelor întocmite şi distribuite la membrii CRS; Rata de participare a membrilor CRS la şedinţe, %	Ne realizat: În perioada de raportare nu au fost desfăşurate şedinţe ale CRS AAC dat fiind faptul că acestea, la etapa respectivă, nu au fost constituită de către noua componenţă a CRD Sud. Abia la finele lunii noiembrie 2020, membrii CRD Sud au decis asupra constituirii a 2 comisii regionale sectoriale în domeniile Alimentare cu Apă, Canalizare şi Infrastructură şi Dezvoltare Economică, Turism şi Dezvoltare Urbană.

ELABORAT:

TOMIESCU Andrei, şef Secţie monitorizare şi evaluare

RUSU Anastasia, şef Secţia planificare şi cooperare regională

POPUŞOI Andrei, şef Secţie managementul integrat al proiectelor

COROIAN Dorin, şef Secţie administrativă

COORDONAT:

Şef Direcţie politici de dezvoltare regională:

Şef Secţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională:

MALAI Igor

TĂBĂCARU Sergiu
